

**REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de la Sierra Sur**  
 Entidad Federativa: **Oaxaca**  
 Clave del RFI: **UNSI0002N**

Nombre: **Univ. Sierra Sur**  
 Crea y Mantenimiento  
 Cargo: **Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento**  
 Teléfono: **01951 57 2 41 00 ext. 1300**  
 Correo electrónico: **chavez77@hotmail.com y navaezor@mas.edu.mx**


Nombre: **Arq. Rafael López Sánchez**  
 Crea y Mantenimiento  
 Cargo: **Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento**  
 Teléfono: **01951 57 2 41 00 ext. 1300**  
 Correo electrónico: **chavez77@hotmail.com y navaezor@mas.edu.mx**

**DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO**

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto ejercido	Monto autorizado	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas		Observaciones	Si se fue inaugurada			Cuenta con Actas
		Obra de construcción	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras				Mantenimiento	Proyecto sustantivo	Españolización			cantidad	metros cuadrados		Inicio	Término	¿Cuenta con los conceptos del evento?	
2	Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.	X			\$ 1,679,470.00	\$ 1,679,470.00	\$ 1,679,470.00	7	156.49	1	3.92	0	17/05/19	30/10/19	Con fecha 25 de junio de 2019 se obtuvo el Oficio de Subsecretaría de planeación e Inversión Pública, actualmente se están integrando las Bases de Licitación para su revisión y visto bueno.				
3	Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS	X			\$ 470,825.00	\$ 470,825.00	\$ 470,825.00	3	189.41	4	20.00	0	17/05/19	17/09/19	Se apartaron las propuestas técnicas y económicas y se emitió el Oficio de convocatoria por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca, quien lleva a cabo la Licitación Pública Nacional.				
4	Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.	X			\$ 2,370,497.00	\$ 2,370,497.00	\$ 2,370,497.00	13	20.00	1	164.22	0	10/09/19	15/12/19	El proyecto se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.				
<b>TOTAL</b>								<b>1</b>	<b>164.22</b>	<b>1</b>	<b>164.22</b>	<b>0</b>							



LE ESTEBAN...  
 Vices de Administración  
 Nombre y firma del Titular de la IES



Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES  
 Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
 Arq. Rafael López Sánchez



**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de la Sierra Sur**  
Entidad federativa: **Oaxaca**  
Clave tra 011: 2083.0023N  
Nombre L C E: **Trick Alexis Ochoa Valencia**  
Cargo: **Vice-Rector de Administración**  
Teléfono: **01 951 57 2 41 00**  
Correo electrónico: **eaor16@hotmail.com y vadm@unissa.edu.mx**

Nombre: **Arg López Salazar**  
Cargo: **Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento**  
Teléfono: **01 951 57 2 41 00, ext. 1306**  
Correo electrónico: **chavane17@hotmail.com y ravalos1@unissa.edu.mx**

Nombre y firma del Titular de la IES: **Lic. Esmeralda Ochoa Valencia**  
Vice-Rectora de Administración  
Nombre y firma del Titular de las Obras y Mantenimiento de la IES: **Arg López Salazar**  
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

OPORTUNIDAD DE AVANCE DEL PROYECTO

Descripción de los trabajos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Avance
reparación de escaleras del pasillo	22	175.00	3850.00	
reparación de las superficies de las exposiciones del pasillo				
cambio de alfombra del pasillo	08.14			
cambio de tosets del lobby del pasillo	124.71			
cambio de muebles de baño del pasillo	6			
cambio de azulejo de baños del pasillo	64.26			
lobby del pasillo		642,702.26		
cambio de manoparas de baños lobby del pasillo	27.00			
Aplicación de pintura en el pasillo de la Universidad	470.00			
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>998.13</b>	<b>\$ 346,400.00</b>	<b>0.00</b>

OPORTUNIDAD DE AVANCE DEL PROYECTO

Descripción de los trabajos	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Avance
Lámparas ahoradoras de energía	20		346,400.00	
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 346,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 692,800.00</b>	<b>0.00</b>

Nombre: **Universidad de la Sierra Sur**  
Entidad federativa: **Oaxaca**  
Clave tra 011: 2083.0023N  
Nombre L C E: **Trick Alexis Ochoa Valencia**  
Cargo: **Vice-Rector de Administración**  
Teléfono: **01 951 57 2 41 00**  
Correo electrónico: **eaor16@hotmail.com y vadm@unissa.edu.mx**

Nombre: **Arg López Salazar**  
Cargo: **Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento**  
Teléfono: **01 951 57 2 41 00, ext. 1306**  
Correo electrónico: **chavane17@hotmail.com y ravalos1@unissa.edu.mx**

DATOS DEL PROYECTO		GLOBAL DEL PROYECTO		GLOBAL DEL PROYECTO	
1. Ejecutar el recurso de acuerdo a la Ley de Adquisición Vigente, siendo el proveedor responsable de la adquisición nacional, dependiendo de los montos a ejecutar.		2. Ejecutar el recurso de acuerdo a la Ley de Adquisición Vigente, siendo el proveedor responsable de la adquisición nacional, dependiendo de los montos a ejecutar.		3. Ejecutar el recurso de acuerdo a la Ley de Adquisición Vigente, siendo el proveedor responsable de la adquisición nacional, dependiendo de los montos a ejecutar.	
3. Emitir el fallo y formalizar la compra de madera, pintura, alfombra, azulejo, impermeabilizante, luminarias, muebles, manoparas, cambio de tosets de la firma de un contrato con el proveedor adjudicado.		3. Emitir el fallo y formalizar la compra de madera, pintura, alfombra, azulejo, impermeabilizante, luminarias, muebles, manoparas, cambio de tosets de la firma de un contrato con el proveedor adjudicado.		3. Emitir el fallo y formalizar la compra de madera, pintura, alfombra, azulejo, impermeabilizante, luminarias, muebles, manoparas, cambio de tosets de la firma de un contrato con el proveedor adjudicado.	
4. Recibir los bienes adjudicados en el proceso de Adquisición ante las instancias establecidas correspondientes.	0	4. Recibir los bienes adjudicados en el proceso de Adquisición ante las instancias establecidas correspondientes.	0	4. Recibir los bienes adjudicados en el proceso de Adquisición ante las instancias establecidas correspondientes.	0
5. Realizar la colocación de muebles (sillas, tosetas, azulejo, luminarias, impermeabilizante) a las acciones de mantenimiento y revisión de cuentas a las instancias correspondientes de la Universidad de la Sierra Sur, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.		5. Realizar la colocación de muebles (sillas, tosetas, azulejo, luminarias, impermeabilizante) a las acciones de mantenimiento y revisión de cuentas a las instancias correspondientes de la Universidad de la Sierra Sur, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.		5. Realizar la colocación de muebles (sillas, tosetas, azulejo, luminarias, impermeabilizante) a las acciones de mantenimiento y revisión de cuentas a las instancias correspondientes de la Universidad de la Sierra Sur, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.	
6. Ejecutar el recurso de acuerdo a la Ley de Adquisición Vigente, siendo el proveedor responsable de la adquisición pública nacional, dependiendo de los montos a ejecutar.		6. Ejecutar el recurso de acuerdo a la Ley de Adquisición Vigente, siendo el proveedor responsable de la adquisición pública nacional, dependiendo de los montos a ejecutar.		6. Ejecutar el recurso de acuerdo a la Ley de Adquisición Vigente, siendo el proveedor responsable de la adquisición pública nacional, dependiendo de los montos a ejecutar.	
7. Emitir el fallo y formalizar la compra de lámparas ahoradoras de energía a través de la firma de un contrato con el proveedor adjudicado.		7. Emitir el fallo y formalizar la compra de lámparas ahoradoras de energía a través de la firma de un contrato con el proveedor adjudicado.		7. Emitir el fallo y formalizar la compra de lámparas ahoradoras de energía a través de la firma de un contrato con el proveedor adjudicado.	
8. Recibir las lámparas y realizar el mantenimiento y la instalación de las lámparas ahoradoras de energía en las áreas correspondientes del edificio de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.		8. Recibir las lámparas y realizar el mantenimiento y la instalación de las lámparas ahoradoras de energía en las áreas correspondientes del edificio de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.		8. Recibir las lámparas y realizar el mantenimiento y la instalación de las lámparas ahoradoras de energía en las áreas correspondientes del edificio de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.	
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 346,400.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 692,800.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

Nombre y firma del Titular de la IES: **Lic. Esmeralda Ochoa Valencia**  
Vice-Rectora de Administración

Nombre y firma del Titular de las Obras y Mantenimiento de la IES: **Arg López Salazar**  
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento




1. Se capturan los egresos que cancelaron a la obra o proyecto. Si continúa siendo hasta fines como sea necesario.  
2. En esta sección se reportan los recibos de forma bruta o neta, independientemente de que se verifiquen en el reporte de egresos.  
3. Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en los dígitos 00, mm y aa.



2019

RDIC



Porcentaje de avance

0

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mesa reportado  
**Junio 2019**  
FOLIO DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Proyecto: 2

Nombre de la obra: Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

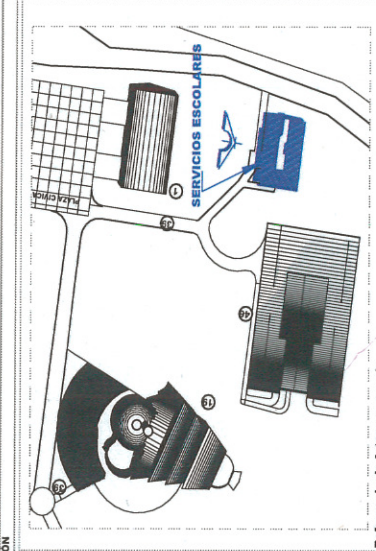

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO BOJAS MIANGOS, SIN,  
ESD. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA MIAHUATLAN DE PORFIRIO  
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.



F1: Edificio de servicios escolares



F2: Aglomeración de estudiantes en el Departamento de Servicios Escolares



F3: Interior Edificio de servicios escolares



F4: Vista posterior Edificio de servicios escolares

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto "Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F1, muestra el Edificio de servicios escolares


La fotografía F2, muestra la Aglomeración de estudiantes en el Departamento de Servicios Escolares

La fotografía F3, muestra Interior del edificio de servicios escolares

La fotografía F4, muestra Vista posterior del Edificio de servicios escolares

Lic. Erick Amador Cruz Valencia  
Vice-rector de Administración

Nombre y firma del Titular del IES



José Raúl López Salazar  
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. El reporte se anexa una vez que se hayan concluido las actividades, como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adedicaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

VICE-RECTORÍA  
DE ADMINISTRACIÓN

Página 1





2019  
ZERO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Junio 2019**  
FECHA DE REPORTE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROPIEDAD: 3 Nombre de la obra: Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

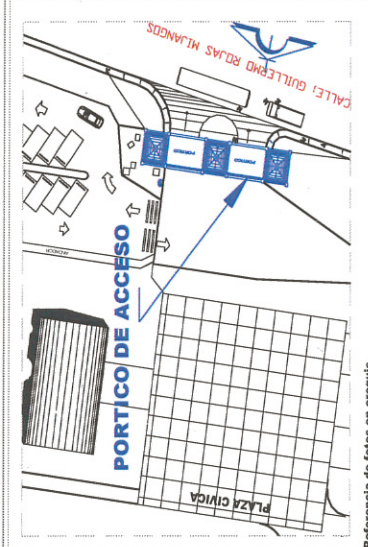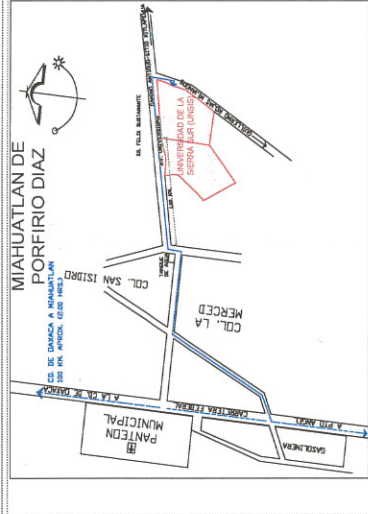

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, SIN.  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSIDAD MIAHUATLAN DE PORFIRIO  
DIAZ, OAXACA, C.P. 76800.

Porcentaje de avance

0

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1: Fachada del portico de la UNSIS



F2: Vista interior del portico donde se instalarán los botiquetes de acceso



F3: Vista de perfil acceso vehicular de la UNSIS



F4: Vista de perfil acceso peatonal de la UNSIS

Comentarios de los trabajos realizados:  
El proyecto "Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS" se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F1, muestra la Fachada del portico de la UNSIS


La fotografía F2, muestra la Vista interior del portico donde se instalarán los botiquetes de acceso

La fotografía F3, muestra la Vista de perfil acceso vehicular de la UNSIS

La fotografía F4, muestra la Vista de perfil acceso peatonal de la UNSIS

Lic. Erick Alvarez Escobar  
Vice-Rector de Asesoría Técnica  
Nombre y firma del Titular de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se genera una plantilla que podrá obtenerse en el sitio web de la IES. Para el caso de obras de mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se anexe fotos del inicio, durante y despues de la obra.






Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCION Y MTO.

VICE-RECTORIA  
DE ADMINISTRACIÓN



REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


<p>2019 MES</p>	<p>4 Número de la obra</p>	<p>Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>
	<p>0 Porcentaje de avance</p>		<p>CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, SIN, ESC. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSIDAD, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.</p>
		<p>Referencia de fotos en croquis</p>	

**FOTOS**

 <p>F1. Vista frontal del almacén de servicios generales</p>	 <p>F2. Bodega de madera improvisada para resguardar materiales</p>	 <p>F3. Acceso a almacén de servicios generales</p>
 <p>F4. Vista posterior del almacén de servicios generales</p>	<p>Comentarios de los trabajos realizados: El proyecto "Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.</p> <p>La fotografía F1, muestra la Vista frontal del almacén de servicios generales</p> <p>La fotografía F2, muestra la Bodega de madera improvisada para resguardar materiales</p> <p>La fotografía F3, muestra el interior del aula C2, equipada con un proyector.</p> <p>La fotografía F4, muestra la Vista posterior del almacén de servicios generales</p>	



Lic. Erick Alarcón Valencia  
Vicecoordinador de Planeación  
Nombre y firma del Titular de la IES



Lic. Eusebio Salazar  
Coordinador de Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN



2019  
AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Fecha de reporte  
**Junio 2019**  
Fecha de corte




Porcentaje de avance

0

Proyecto 5  
Nombre de la obra


**Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

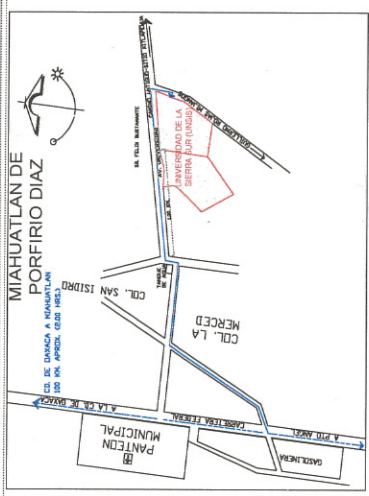

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, SIN, ESQ. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

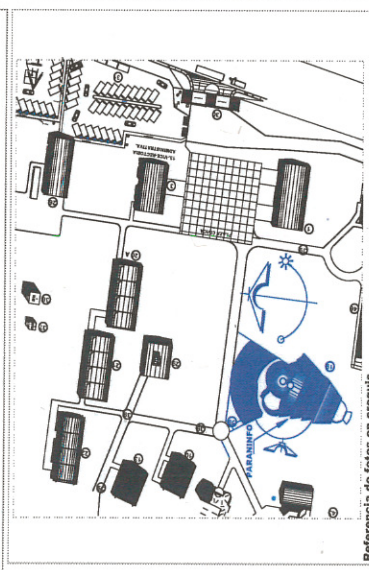

Referencia de fotos en croquis


**FOTOS**




F1: Fachada del paramento



F2: Vista lateral del paramento

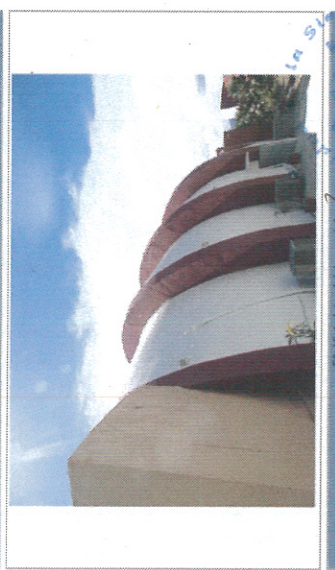

F3: Vista lateral del paramento

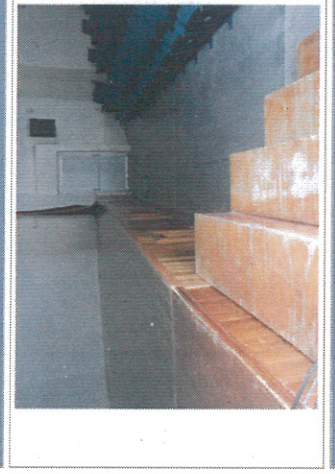

F4: Piso del escenario del paramento



F5: Piso del acceso principal

Comentarios de los trabajos realizados:  
El proyecto "Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

- La fotografía F1: Fachada del paramento
- La fotografía F2: Vista lateral del paramento
- La fotografía F3: Vista lateral del paramento
- La fotografía F4: Piso del escenario del paramento
- La fotografía F5: Piso del acceso principal
- La fotografía F6: Placa y luminarias
- La fotografía F7: Loseta del lobby
- La fotografía F8: Pintura e impermeabilizante
- La fotografía F9: Sanitarios para mujeres en el paramento


Lic. Erick Álvarez Valencia  
Vicecoordinador de Planeación

Nombre y firma del titular de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todos los cobros. Para ello se anexará planilla, respaldada con las pesadas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adquisiciones, en especial, se recomienda que se registre la misma como, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



VICE-RECTORIA  
DE ADMINISTRACIÓN



DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCIÓN Y MTO.



2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Fecha reportado  
Junio\_2019  
FECHA DE REPORTE



Porcentaje de avance

0


PRIMERA 5

Nombre de la obra: Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

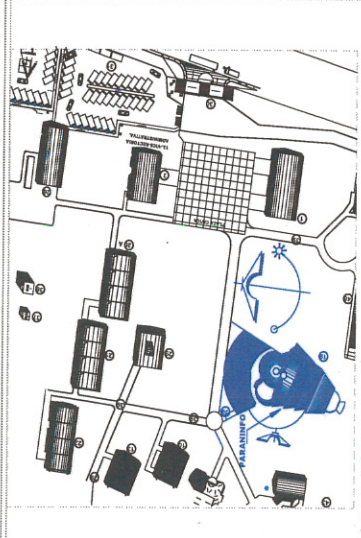


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MILANGOS, SIN, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS

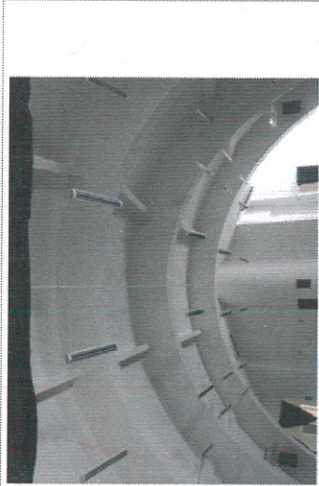


F6: Píntura e impermeabilizante



F7: Loseta del lobby

Comentarios de los trabajos realizados:  
El proyecto "Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.  
La fotografía F1: Fachada del paramento  
La fotografía F2: Fachada del paramento  
La fotografía F3: Vista lateral del paramento  
La fotografía F4: Piso del escenario del paramento  
La fotografía F5: Piso del acceso principal  
La fotografía F6: Píñon y luminarias  
La fotografía F7: Loseta del lobby  
La fotografía F8: Pintura e impermeabilizante  
La fotografía F9: Sanitarios para mujeres en el paramento

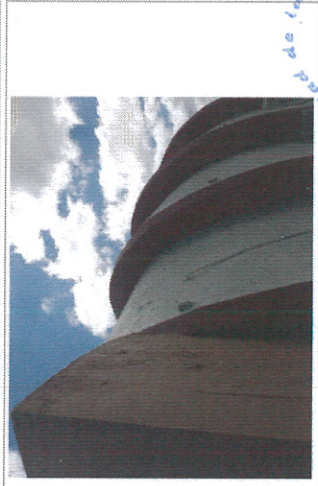

F8: Pintura e impermeabilizante




F9: Sanitarios para mujeres en el paramento

Lic. Erick Hernández Valencia  
Vicecoordinador de Planeación  
Nombre y firma del Trabajador de la IES



Ing. Pablo Rodríguez Salazar  
Coordinador de Planeación y Mantenimiento  
Nombre y firma del Trabajador de Obras y Mantenimiento de la IES



\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. En caso de que se necesite, se podrá copiar tantas pastas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture el mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

DEPTO. DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MTO.



2019

2ND

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes respectivo  
**Junio\_2019**  
FICHERO DE OBRAS

REPORTÉ FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROPIEDAD 6


Nombre de la obra: **Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía.**




Porcentaje de avance

0

CHOCUOS DE LOCALIZACIÓN

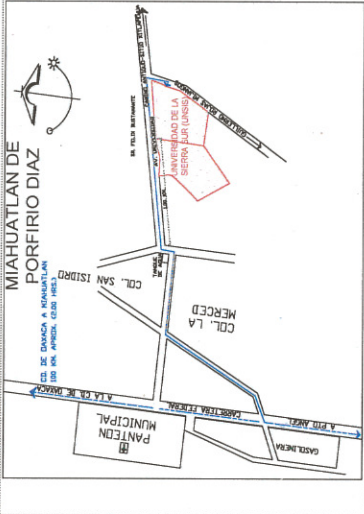

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

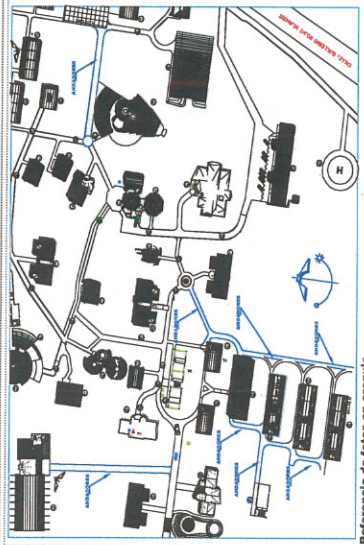

CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, SIN.  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO  
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1. Aspecto de luminarias actuales



F2. Aspecto de luminarias actuales en andadores



F3. andador a biblioteca



F4. andador de plazuela a paramirito




F5. andador hacia aulas y salas de cómputo

Comentarios de los trabajos realizados:  
El proyecto "Iluminación de andadores de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía," se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

- La fotografía F1, muestra el Aspecto de luminarias actuales
- La fotografía F2, muestra el Aspecto de luminarias actuales en andadores
- La fotografía F3, muestra el andador a biblioteca
- La fotografía F4, muestra el andador de plazuela a paramirito
- La fotografía F5, muestra el andador hacia aulas y salas de cómputo

LE. Erika Alejandra Valencia  
Vicecoordinadora de Planeación  
Nombre y Firma del Titular de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se requiere una postcard, se piden copiar tantas postales como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y subcontratos, en especial, se recomienda que se capture la primera toma, primero ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



VICE-REGISTRACIÓN  
DE ADMINISTRACIÓN

DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCION Y MTO.
