



Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Calle 1911 20181200231
Nombre LICE: Esc. Aca. Oaxaca Viena
Cajp: Vna - Rector de Administración
Teléfono: 01 981 57 2 41 00
Correo electrónico: aca@unisis.edu.mx y vna@unisis.edu.mx

Responsables:
Nombre: Arq. Rafael López Salazar
Cajp: Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01981 57 2 41 00 ext. 1308
Correo electrónico: rafael@unisis.edu.mx

Responsables:
Nombre: Arq. Rafael López Salazar
Cajp: Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01981 57 2 41 00 ext. 1308
Correo electrónico: rafael@unisis.edu.mx

Responsables:
Nombre: Arq. Rafael López Salazar
Cajp: Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01981 57 2 41 00 ext. 1308
Correo electrónico: rafael@unisis.edu.mx

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance?	Acciones por realizar	% de avance		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Causa)	Si va a ser inaugurado		Cuanti con Actas		
		Equipo	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacios físicos	cantidad			metros cuadrados	Inicio			Termino	¿Cuándo y con qué? (Causa)		Entrega de Actas Administrativas	
2	Ampliación del Edificio de la Universidad de la Sierra Sur.	X			\$ 1,679,470.00	\$ 1,679,470.00		6	183.14		Con fecha 12 de agosto se emitió el fallo de la licitación, se firmó el contrato el 13 de agosto y se inició el trabajo el 14 de agosto. En el presente año, se actualizó el presupuesto con la inclusión de partidas, armado de planilla, y se está emitiendo el expediente para su adjudicación.	4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la supervisión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes de la Universidad de la Sierra Sur y del Estado. 6. Ejecutar el proyecto, cubriendo la rendición de cuentas.	GLOBAL DEL PROYECTO	7	14/08/19	31/12/19	Con fecha 12 de agosto se emitió el fallo de la licitación, se firmó el contrato el 13 de agosto y se inició el trabajo el 14 de agosto. En el presente año, se actualizó el presupuesto con la inclusión de partidas, armado de planilla, y se está emitiendo el expediente para su adjudicación.	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Causa)	¿Cuándo y con qué? (Causa)	Entrega de Actas Administrativas	Monto de Actas Administrativas
3	Sistema de acceso y seguridad a la UNISIS	X			\$ 470,020.00	\$ 110,892.86	\$ 359,127.14	7	20.00		Prueba formalización de contrato, se realizó el suministro y colocación de los biométricos para el acceso, quedando pendientes de algunas partidas menores que se encuentran en el expediente para su adjudicación.	5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes de la Universidad de la Sierra Sur y del Estado. 6. Ejecutar el proyecto, cubriendo la rendición de cuentas.	GLOBAL DEL PROYECTO			Prueba formalización de contrato, se realizó el suministro y colocación de los biométricos para el acceso, quedando pendientes de algunas partidas menores que se encuentran en el expediente para su adjudicación.					
4	Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.	X			\$ 2,370,497.00	\$ 2,370,497.00		8	237.11		Prueba emisión del dictamen de autorización de la revisión y visto bueno de las bases de licitación por parte de la Comisión de Contratación y programación de las actividades de construcción de las obras de infraestructura de la Universidad de la Sierra Sur y del Estado.	2. Ejecutar el proceso de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Vigilancia, Control y Rendición de Cuentas, dependiendo de los montos a ejecutar. 3. Emitir el fallo y formalizar el contrato. 4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la supervisión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes de la Universidad de la Sierra Sur y del Estado. 6. Ejecutar el proyecto, cubriendo la rendición de cuentas.	GLOBAL DEL PROYECTO	0	04/10/19	31/12/19	Prueba emisión del dictamen de autorización de la revisión y visto bueno de las bases de licitación por parte de la Comisión de Contratación y programación de las actividades de construcción de las obras de infraestructura de la Universidad de la Sierra Sur y del Estado.				
TOTAL								16	20.00												

Lejandra López Salazar
Rectora de Administración
Nombre y Firma del Titular de la ES



Lejandra López Salazar
Rectora de Administración
Nombre y Firma del Titular de la ES

Lejandra López Salazar
Rectora de Administración
Nombre y Firma del Titular de la ES

Lejandra López Salazar
Rectora de Administración
Nombre y Firma del Titular de la ES

Lejandra López Salazar
Rectora de Administración
Nombre y Firma del Titular de la ES



Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad Federativa: Oaxaca
Calle: Carretera 111, 20190, OXACA
Código Postal: 71500
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: unisis@unisis.edu.mx y unisis@unisis.edu.mx

Nombre: Lic. Edox Avelar Corona Villanueva
Cargo: Vice-Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: unisis@unisis.edu.mx y unisis@unisis.edu.mx

Nombre: Ing. Reginal López Sánchez
Cargo: Jefe del Depto. De Proyecto, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01 951 57 2 41 00 ext. 1306
Correo electrónico: unisis@unisis.edu.mx y unisis@unisis.edu.mx

Nombre: Ing. Reginal López Sánchez
Cargo: Jefe del Depto. De Proyecto, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01 951 57 2 41 00 ext. 1306
Correo electrónico: unisis@unisis.edu.mx y unisis@unisis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Actividad	Presupuesto	Avance	Porcentaje	Observaciones	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado
6 Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.	\$ 642,702.26	\$ 642,702.26	100%	Se cuenta con el Oficio de autorización estatal, y se están integrando la información para iniciar con el proceso de licitación.	30/09/19	31/12/19	En proceso
6 Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur.	\$ 346,400.00	\$ 306,000.00	88.14%	Se cuenta con el Oficio de autorización estatal, y se están integrando la información para iniciar con el proceso de licitación.	17/05/19	30/09/19	En proceso
TOTAL	\$ 989,102.26	\$ 948,702.26	95.91%				

1. Se capturaron los reportes que corresponden a la data o proyecto. Se pueden tener listas más completas de los reportes de avance de los proyectos de la Universidad de la Sierra Sur.

2. En este documento se muestran los avances y porcentajes de los reportes de avance de los proyectos de la Universidad de la Sierra Sur.

3. Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en los reportes de avance de los proyectos de la Universidad de la Sierra Sur.

Le Edox Avelar Corona Villanueva
Vice-Rector de Administración
Nombre y Firma del Titular de la FIS

Ing. Reginal López Sánchez
Jefe del Depto. De Proyecto, Construcción y Mantenimiento
Nombre y Firma del Titular de Oaxaca y Mantenimiento de la FIS

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INGRESO DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO 2 Nombre de la obra

Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.



CURSOS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

7

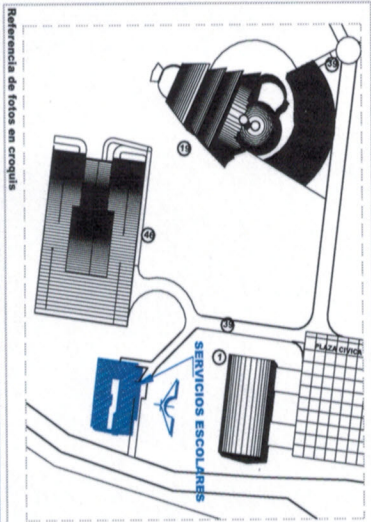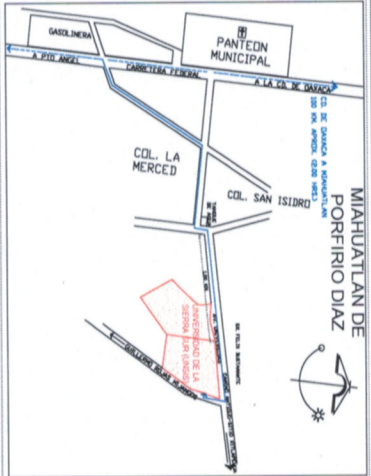

Referencia de fotos en croquis

CALLE GUILLERMO ROJAS MIAHUANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70890.


FOTOS



F1: Edificio de servicios escolares



F2: Muestra parte posterior del edif. Servicios Escolares, acero en columnas.

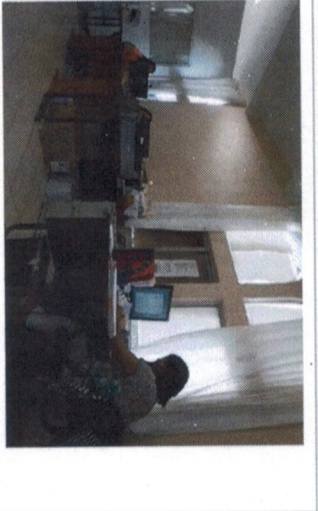

F3: Interior Edificio de servicios escolares



F4: Vista posterior Edificio de servicios escolares



Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso constructivo.
La fotografía F1, muestra el Edificio de servicios escolares, trabajos de cimentación
La fotografía F2, Muestra parte posterior del edif. Servicios Escolares, acero en columnas.
La fotografía F3, muestra Interior del edificios de servicios escolares
La fotografía F4, muestra Vista posterior de la ampliación del Edificio de servicios escolares, en fase
La fotografía F5, muestra obra en cimentación de Ampliación del Edificio de servicios escolares.

Le, Edda, Encargada del Proyecto
Nombre y Apellido del Encargado
Nombre y Apellido del Titular de la IES

Le, Edda, Encargada del Proyecto
Nombre y Apellido del Encargado
Nombre y Apellido del Titular de la IES

Le, Edda, Encargada del Proyecto
Nombre y Apellido del Encargado
Nombre y Apellido del Titular de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico ordenado. Una obra "Para ello se anexa una planilla, se pueden pegar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OAXACA
VICERECTORÍA DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

2019

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Fecha reportado
Agosto 2019
Fecha de corte



Porcentaje de avance


73.18

PROYECTO 3 Nombre de la obra

Sistema de acceso y seguridad a la UNISIS

CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

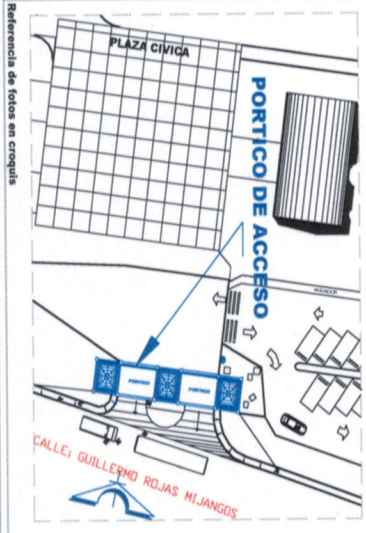

CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, SM,
ESQ. AV UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1: Fachada del portico de la UNISIS



F2: Vista interior del portico con los torniquetes de acceso


Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Sistema de acceso y seguridad a la UNISIS" se encuentra en proceso constructivo

La fotografía F1, muestra la Fachada del portico de la UNISIS

La fotografía F2, Vista interior del portico con los torniquetes de acceso

La fotografía F3, Instalacion de paneles de control, Interior caseta de la UNISIS

La fotografía F4, Vista de perfil acceso peatonal con torniquetes de la UNISIS

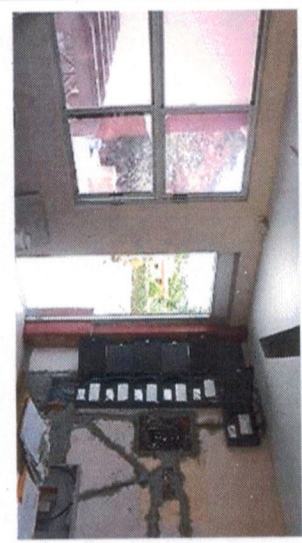

F3: Instalacion de paneles de control, Interior caseta de la UNISIS



F4: Vista de perfil acceso peatonal con torniquetes de la UNISIS

Lic. Erick Dávalos Ochoa, Ingeniero
Vicerrector de Asesoría Técnica
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Efraim López Sotelo
Alcalde del Depto. de Asesoría, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Ing. Efraim López Sotelo
Alcalde del Depto. de Asesoría, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reportes fotográficos de todos los frentes. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar otras plantillas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTT

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mesa reportada
Agosto 2019
FICHA DE CONTE

FONDO DE APORTACIONES MULTILES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL IMPORTE DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO: 4

Nombre de la obra

Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.


GRUPOS DE LOCALIZACIÓN

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

0

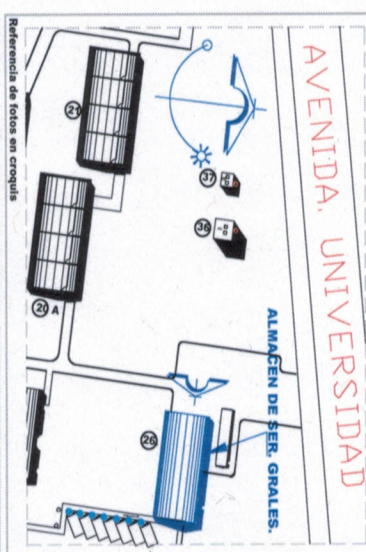

CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, SM,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.



F1. Vista frontal del almacén de servicios generales



F2. Bodega de madera improvisada para adquirir materiales



F3. Acceso a almacén de servicios generales



F4. Vista posterior del almacén de servicios generales

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto "Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur" Previa emisión del oficio de autorización, se inició la revisión de los planos de construcción por parte de la Contraloría. Esta programación se publicó en las páginas el 07 de septiembre de 2019.

La fotografía F1, muestra la Vista frontal del almacén de servicios generales

La fotografía F2, muestra la Bodega de madera improvisada para adquirir materiales


La fotografía F3, muestra el interior del aula C2, equipada con un proyector.

La fotografía F4, muestra la Vista posterior del almacén de servicios generales

Lic. Edith Alicia Ochoa Villalpando
Vicedirectora de Administración
Nombre y Firma del Titular de la OES



Dr. Roberto Flores Sánchez
Coordinador de Proyectos de Construcción y Mantenimiento
Nombre y Firma del Titular de OES y Mantenimiento de la OES



DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

2019

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Meis reportado
Agosto 2019
FOLIO DE FONTE

FONO DE APORTACIONES MULTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mantenimiento de infraestructura academica en la Universidad de la Sierra Sur.



CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

0

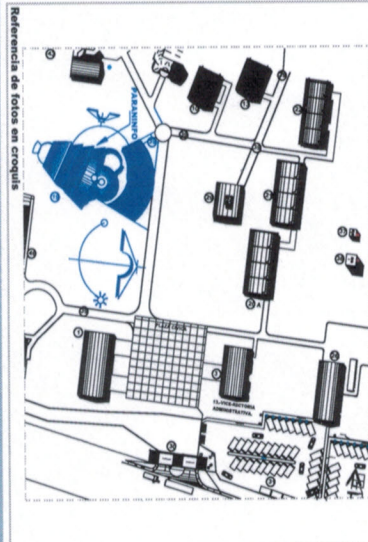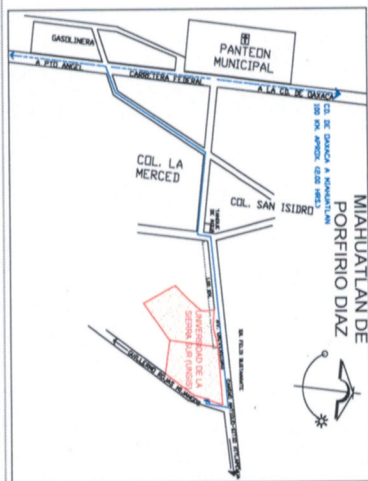

Referencia de fotos en croquis

CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.



F1: Fachada del paramento




F2: Vista lateral del paramento

Contenidos de los trabajos realizados:
El proyecto "Mantenimiento de infraestructura academica en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso de Autorizacion ante las instancias estatales correspondientes.

- La fotografia F1: Fachada del paramento
- La fotografia F2: Vista lateral del paramento
- La fotografia F3: Vista lateral del paramento
- La fotografia F4: Piso del acceso del paramento
- La fotografia F5: Piso del acceso principal
- La fotografia F6: Plafón y luminarias
- La fotografia F7: Losetas del lobby
- La fotografia F8: Pintura e impermeabilizante
- La fotografia F9: Sernacina para mujeres en el paramento



F3: Vista lateral del paramento

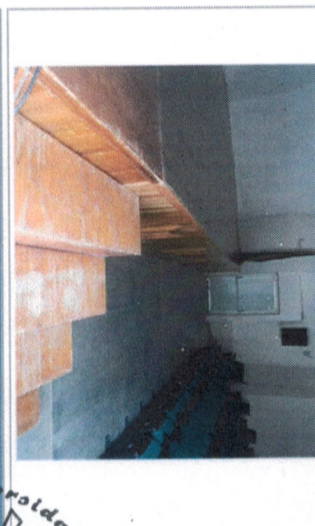

F4: Piso del acceso del paramento



F5: Piso del acceso principal

Nombre y firma del responsable de la IE:

Le. Erick Alexis Ochoa V.
Vice-Rector de Admision y Registro de la IE

Nombre y firma del responsable de la IE:

José Sandoz
Jefe del Departamento de Mantenimiento
Vice-Rector de Infraestructura y Mantenimiento de la IE

Nombre y firma del responsable de la IE:

José Sandoz
Jefe del Departamento de Mantenimiento
Vice-Rector de Infraestructura y Mantenimiento de la IE

DEPTO.- DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTISERES


REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE PORTALCENAMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Mantenimiento de Infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Mes reportado
Agosto 2019
FECHA DE COPIE



Porcentaje de avance

0

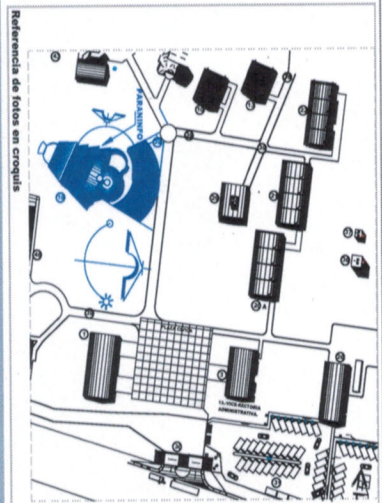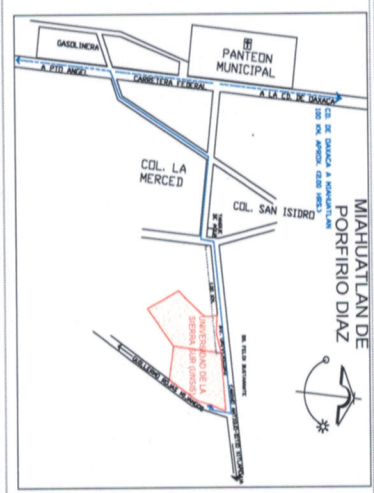


CALLE GUILLERMO ROSAS MUJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD,
UNIVERSITARIA, MAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.


FOTOS



F1: Exterior y techumbre

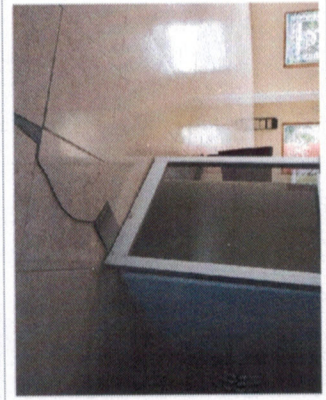

F2: Lantai del lobby

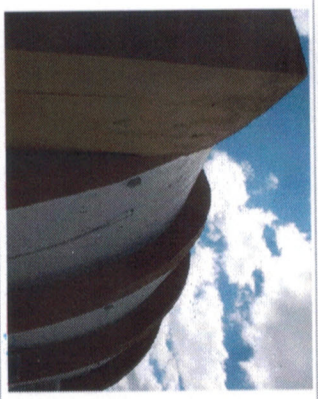

F3: Pintura e impermeabilizante



F4: Sanitarios para mujeres en el paranteo

Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto "Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur", Se cuenta con el Oficio de autorización estatal, y se están integrando la información para iniciar con el proceso de licitación.

- La fotografía F1: Fachada del paranteo
- La fotografía F2: Vista lateral del paranteo
- La fotografía F3: Vista lateral del paranteo
- La fotografía F4: Piso del escenario del paranteo
- La fotografía F5: Piso del escenario principal
- La fotografía F6: Escenario principal
- La fotografía F7: Lantai del lobby
- La fotografía F8: Pintura e impermeabilizante
- La fotografía F9: Sanitarios para mujeres en el paranteo

Le Erick Alvarado
Viceministro de Infraestructura
Nombre y firma del Titular de la IES



Jefe del Departamento de Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

[Handwritten signature]



DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.





Porcentaje de avance

90

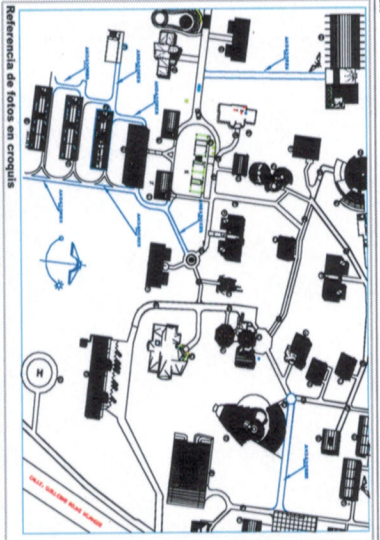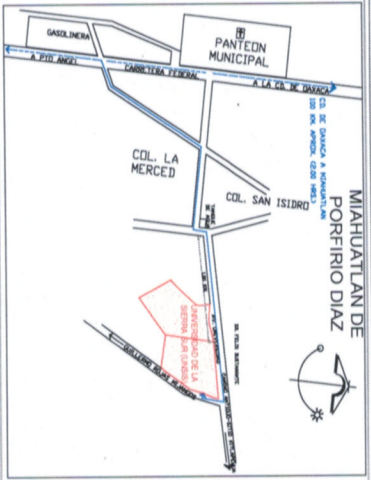

Referencia de fotos en croquis

CALLE GUILLERMO ROSAS MIJANGOS, SM,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD OLIVERO CO,
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto "Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía", previa formalización del contrato, se realizó el suministro y colocación de las lámparas ahorradoras de energía, quedando una economía, para la compra de 3 lámparas, de la cual se está integrando el expediente para su adjudicación.


La fotografía F1. Cambio de lámparas de sodio por lámparas solares

La fotografía F2. Cambio de lámparas de sodio por lámparas solares

La fotografía F3. Colocación de lámparas solares en el andador a biblioteca

La fotografía F4. muestra el andador a permitirlo, con lámparas solares

La fotografía F5. Colocación de lámparas solares en andador hacia aulas y salas de cómputo

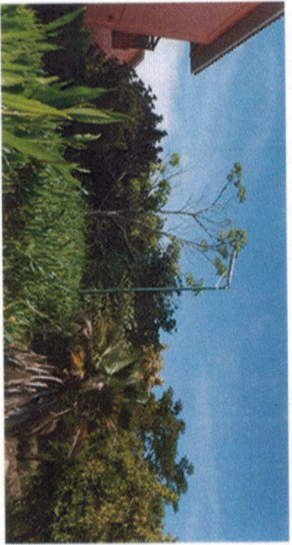

F1. Cambio de lámparas de sodio por lámparas solares




F2. Cambio de lámparas de sodio por lámparas solares



F3. Colocación de lámparas solares en el andador a biblioteca



F4. muestra el andador a permitirlo, con lámparas solares

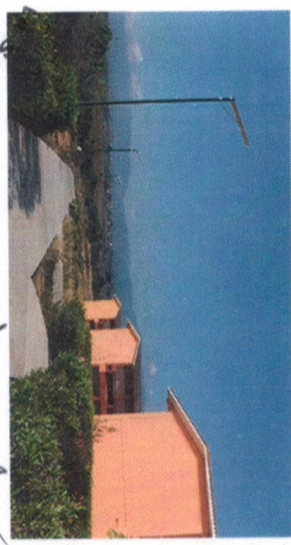

F5. Lámparas solares en andador hacia aulas y salas de cómputo

Le Erick Alamo Ochoa
Vicecoordinador de Asesoría Técnica

Nombre y firma del TITULAR DE LA OBRAS



Jefe del Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Nombre y firma del TITULAR DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LA OBRAS



* Es muy importante que se anote riguroso logotipo de todos los obras. Para ello se anexa una plantilla, la podrá obtener en estas pastillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adopciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
