

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad Federativa: Oaxaca
Clave Inst 911: 20MSLU023N

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice- Rector de Administración
Teléfono: 01 981 572 41 00
Correo electrónico: aovr16@hotmail.com y eadmi@uniss.edu.mx

Planificación

Nombre: An. Rafael López Salazar
Cargo: Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01981 572 41 00 ext. 1306
Correo electrónico: chavaan77@hotmail.com y rnavado@uniss.edu.mx

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Otra de construcción	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fecha ³		Observaciones	Cuenta con Actas						
							Equipamiento	Mantenimiento	Proyecto sust			cantidad	metros cuadrados		Inicio	Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Cuenta con Acta de Recepción (Acta Inaugur.)?	Acta Administrativa de Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Construcción de Cafetería (Terminación)	X		\$5,400,750.00	\$ 5,400,750.00	\$0.00				Comedor cocina, almacenes, fijos atención a comensales vestibulo, escaleras Sanitarios	2 1 2 2 4	958.94 162.03 109.02 72.07 82.50	100	10/09/22	21/01/23	Proyecto concluido	si	si	si	si	\$5,400,750.00
2	Construcción de una Cancha de Basquetbol Techeda (Terminación)	X		\$4,310,970.00	\$ 4,310,970.00	\$0.00			TOTAL cancha de básquetbol gradas sanitarios mujeres vestidores mujeres sanitarios hombres vestidores hombres oficina encargado escalera juegos de mesa	11 1 1 1 1 1 1 1 1	1384.56 671.74 138.20 17.95 20.83 17.85 20.83 12.78 8.92 99.17	100	10/09/22	21/01/23	Proyecto concluido	si	si	si	si	\$ 4,310,970.00	
3	Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños	X		\$8,870,006.00	\$ 8,870,006.00	\$0.00			TOTAL aulas sanitarios Escaleras	9 7 2 2	1009.27 711.82 54.76 303.40	100	19/07/22	15/03/23	Proyecto concluido	si	si	si	si	\$8,870,006.00	

Nombre y firma del Titular de la ANES

Lib. Edith Zúñiga Gómez Valencia
Vigilante de Administración

Nombre y firma del Titular de la ANES

Zg. Rafael López Salazar
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2022
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Marzo 2023
FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca

Cuenta Inst 911: 20545U023N

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vicer- Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eao16@hotmail.com y vao16@uniss.edu.mx

Planación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Aro Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavane77@hotmail.com y ralsalvador@uniss.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto.			Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	Cuenta con Actas					
		Otra de cont	Equipam	Adeducione				Mantenim	Proyecto sus	cantidad			metros cuadrados	Inicio		Término	¿Cuenta con fotos con fecha del evento?	¿Quin y Receptión inaugurado?	Entrega Receptión (ingreso)	Acta Receptión (ingreso)	Monto de Acta Administrativa
5	Equipamiento para Laboratorios de la DES de salud	X			\$3,007,750.00	\$ 3,007,750.00	\$0.00	lector de radiografía dental unidad dental con escanador ultrasónico, fotopolimerizador, cámara intraoral y pantalla bomba de vacío equipo de radiología dental para montaje a pared vibrador dental	1 16 8 2 1		Proyecto concluido	100	15/07/22	20/12/22	Proyecto concluido						\$3,007,750.00
7	Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad		X		\$6,056,067.00	\$6,056,067.00	\$0.00	estacionamiento de bicicletas, motocicletas, automóviles, caseta de vigilancia	1.00	3252.29	Proyecto concluido	100	13/09/2022	24/02/2023	Proyecto concluido						\$6,056,067.00
	TOTAL							TOTAL	1	3252.29	Proyecto concluido	100									



Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerrector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Aro Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden anotar tanto filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactan de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejando en el reporte mensual.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

2023

Fecha reportada

FECHA DE OBTENICIÓN

FECHA DE OBTENICIÓN

FECHA DE OBTENICIÓN

FECHA DE OBTENICIÓN

FECHA DE OBTENICIÓN

FECHA DE OBTENICIÓN

FECHA DE OBTENICIÓN

FECHA DE OBTENICIÓN



Porcentaje de avance



100

1

Nombre de la obra:

Construcción de Cafetería (Terminación)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

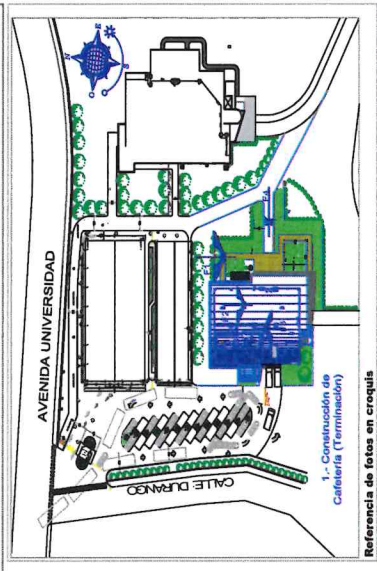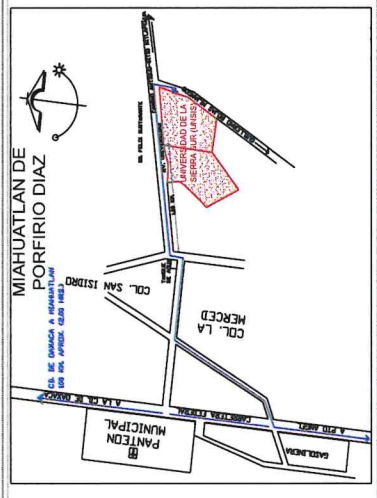


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA, CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

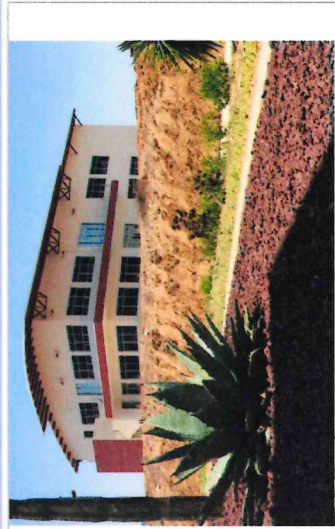

F1- Vista panorámica



F2- Comedor - Planta Baja



F3- Comedor - Planta Alta



F4- Baños - Planta Baja



F5- Baños - Planta Alta

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de Cafetería (Terminación)
Proyecto concluido

- La fotografía muestra: F1- Vista panorámica
- La fotografía muestra: F2- Comedor - Planta Baja
- La fotografía muestra: F3- Comedor - Planta Alta
- La fotografía muestra: F4- Baños - Planta Baja
- La fotografía muestra: F5- Baños - Planta Alta

Lic. Erick Alexis Córdova Velázquez
Vicerector de Apoyos
Nombre y firma del titular de la ES



Dr. Rafael López Salazar
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la ES

* Es muy importante que se genere reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

VICE-RECTORÍA

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MANTO.



2022

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Más reportado
Marzo_2023
FECHA DE CURLE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL
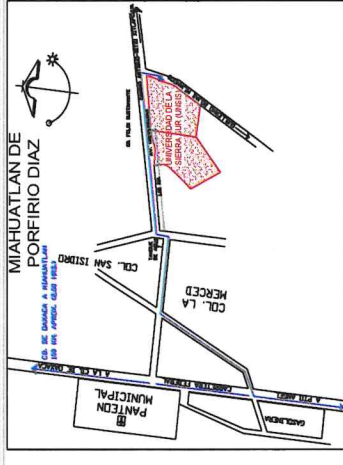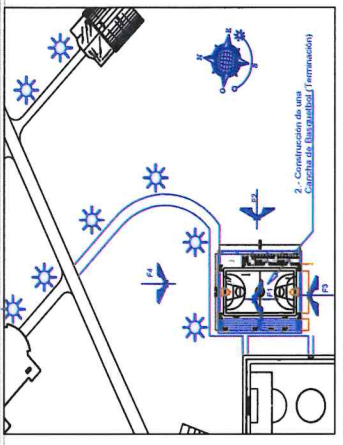
<p>PROYECTO</p> <p>2 Nombre de la obra: Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada (Terminación)</p>	<p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> <p>CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 710800.</p>
<p>Referencia de fotos en croquis</p>  <p>2.- Construcción de una Cancha de Basquetbol (Terminación)</p>		<p>FOTOS</p> <p>Referencia de fotos en croquis</p>




Porcentaje de avance

100

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada (Terminación)
Proyecto concluido

La fotografía muestra: F1- Cubierta metálica
La fotografía muestra: F2- Pintura en Cancha
La fotografía muestra: F3- Lámparas colgantes
La fotografía muestra: F4- Andador
La fotografía muestra: F5: Malla

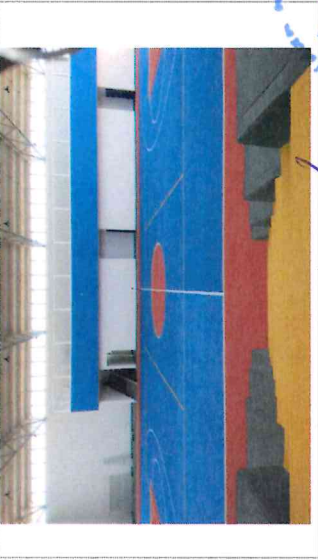

Lic. Erick Alexis Ochoa Zamora
Vicerrector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

Lic. Erick Alexis Ochoa Zamora
Vicerrector de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2022

2022

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado



Marzo_2023

FOLIO DE CURRÉ:

REPORTÉ FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO: 3 Nombre de la obra: Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

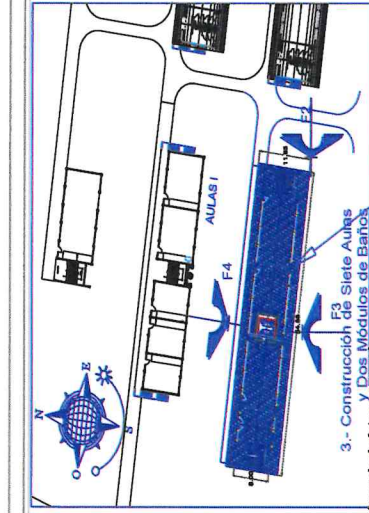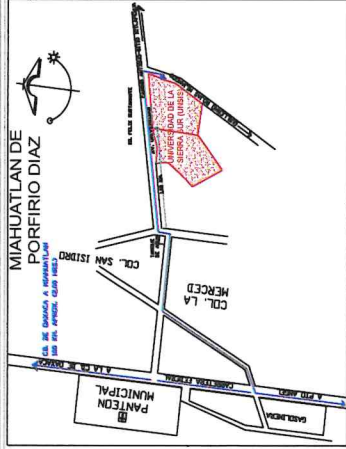

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Porcentaje de avance

100

CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N,
ESO, AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD,
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.


FOTOS



F1- Aula - Interior



F2- Vista Lateral

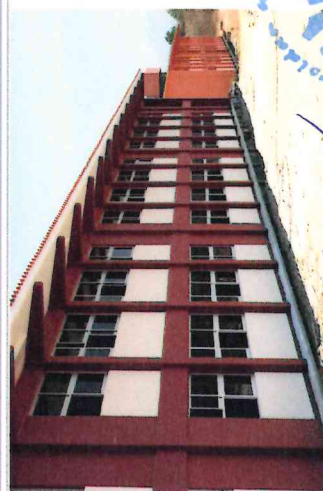

F3- Vista Posterior



F4- Sanitarios - interior



F5- Pasillo Planta Baja

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños
Proyecto concluido

La fotografía muestra: F1- Aula - Interior

La fotografía muestra: F2- Vista Lateral

La fotografía muestra: F3- Vista Posterior

La fotografía muestra: F4- Sanitarios - Interior

La fotografía muestra: F5- Pasillo Planta Baja

Lic. Erick Alexis Cobos Valencia
Vicepresidente de Administración

Nombre y firma del Titular de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexará un pasaporte, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma zona, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2022

AÑO



Porcentaje de avance

100

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



Mes reportado
Marzo_2023

FECHA DEL REPORTE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO: 5 Equipamiento para Laboratorios de la DES de salud

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

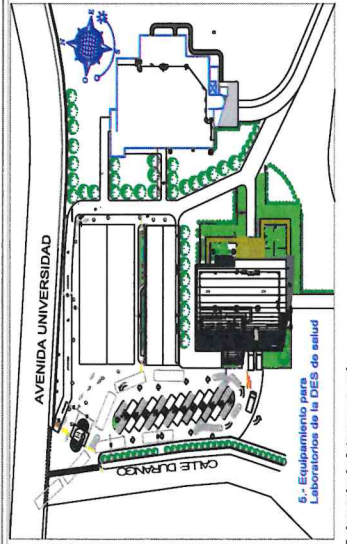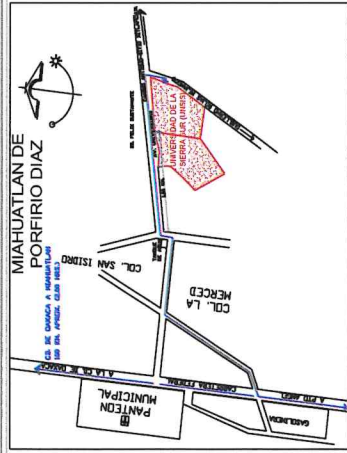

Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MILANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- LECTOR DE RADIOGRAFÍA DENTAL - VIBRADOR

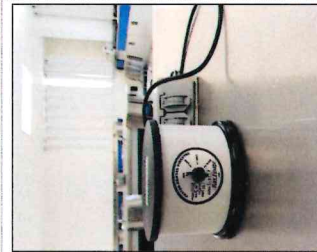


F3- BOMBA DE VACIO - LOCKERS




F2- BOMBA DE VACIO - EQUIPO DE RADIOLOGIA DENTAL



F5- MESAS DE ACERO INOXIDABLE

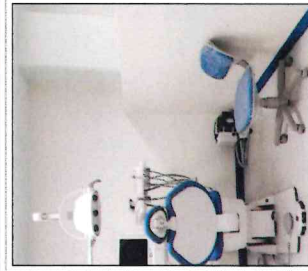

F3- BOMBA DE VACIO - LOCKERS



F5- UNIDAD DENTAL CON ESCAREADOR ULTRASONICO, FOTOPOLIMERIZADOR, CAMARA INTRABUCAL Y PANTALLA



F5- MESAS DE ACERO INOXIDABLE

Comentarios de los trabajos realizados:
El proyecto: Equipamiento para Laboratorios de la DES de salud
Proyecto concluido

- Fotografía F1- LECTOR DE RADIOGRAFIA DENTAL - VIBRADOR
- Fotografía F2- BOMBA DE VACIO - EQUIPO DE RADIOLOGIA DENTAL
- Fotografía F3- BOMBA DE VACIO - LOCKERS
- Fotografía F4- UNIDAD DENTAL CON ESCAREADOR ULTRASONICO, FOTOPOLIMERIZADOR, CAMARA INTRABUCAL Y PANTALLA
- Fotografía F5- MESAS DE ACERO INOXIDABLE



Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
Abel Rafael Lobos-Salvador

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerrector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todos los trabajos. Para ello se anexa una plantilla, se pedirá copiar todas las plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Marzo 2023
FECHA DEL REPORTE:



Porcentaje de avance



100

PROYECTO 7

Nombre de la obra:

Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

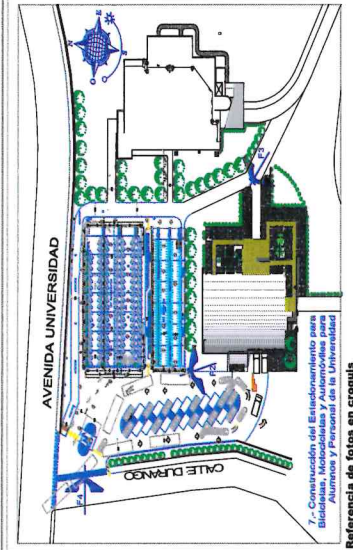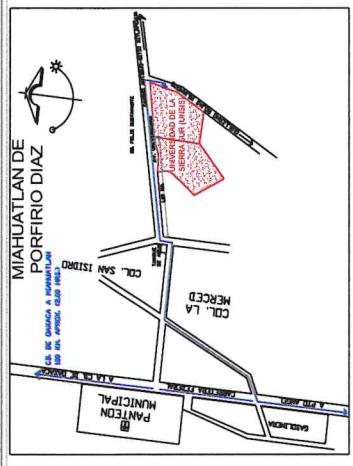

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO
CALLE GUILLERMO ROJAS MUÑANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD,
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1- Estacionamiento Vehicular



F2- Acceso Peatonal, Bicicletas y Motocicletas



F3- Acceso Peatonal



F4- Estacionamiento Bicicletas



F5- Estacionamiento Motocicletas

Comentarios de los trabajos realizados:

Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para
El proyecto: Alumnos y Personal de la Universidad


Proyecto concluido

- La fotografía muestra: F1- Estacionamiento Vehicular
- La fotografía muestra: F2- Acceso Peatonal, Bicicletas y Motocicletas
- La fotografía muestra: F3- Acceso Peatonal
- La fotografía muestra: F4- Estacionamiento Bicicletas
- La fotografía muestra: F5- Estacionamiento Motocicletas

Lic. Erick Alvarez Torres Valencia
Vicecoordinador de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Ag. Rafael López Salgado
Jefe del Depto. de Proyecto, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, en la que se capturan datos, como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la planilla tanto antes, durante y después de la obra.
