

2023



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Marzo_2023
FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst 911: 20MSU023N

RESPONSABLES

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 90
Correo electrónico: eaoval16@hotmail.com y vadrin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanell7@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | | | Monto autorizado | Monto ejercido | Remanente | Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1 | | | Acciones que sustentan el avance 2 | Acciones por realizar | % de avance | Fechas 3 | | Observaciones | ¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas) | Si ya fue inaugurada | | Cuenta con Actas | | |
|-----------|--|------------------|--------------|---------------|------------------|----------------|-----------|--|--|----------------------|------------------------------------|--|---|----------|------------------|---------------|--|----------------------|---------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | Obra de civil | Equipamiento | Adscripciones | | | | Mantenimiento | Proyecto sus | Espacio/equipo | | | | cantidad | metros cuadrados | | | Inicio | Término | ¿Cuenta con fotos del evento? | ¿Quién y cuándo inauguró? | Entrega- Recepción (Acta Inicial) |
| 1 | Terminación de la Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad, con cubierta de Paneles Solares. | X | | | | \$6,712,208.00 | \$0.00 | \$6,712,208.00 | pórtico de acceso estacionamiento caseta de inversores | 1.00 1.00 1.00 | 305.30 3449.70 12.57 | Este proyecto esta en proceso de Rectificación | 1- Suministro y colocación de estructura metálica para soportar paneles solares, compuesta por columnas, traves, largueros, y contra vientos metálicos, con soldadura, terminados con primer y pintura anti-rust. 2- Suministro y colocación de largueros de aluminio estructural anodizado para sujeción de paneles solares, protecciones en corriente directa y en corriente alterna y puesta a tierra de paneles solarese inversores. 3- Suministro y colocación de paneles fotovoltaicos Mono cristalino de 330 watts, tablero i-line mg600m182b, de 18 circuitos, inversores de voltaje, interruptores termo magnético de 3x60 a 4- Construcción de caseta de inversores, con cimentación a base de zaparas corridas y contra traves de concreto armado, estructura de columnas y losa de concreto armado, muros de ladrillo rojo, aplandados y terminados con pintura vinilica lavable, piso de concreto acabado rayado, puertas y ventanas con aluminio y cristal filtra sol, iluminación con lámparas led. 5- Suministro y colocación de tubo conduit pvc tipo pesado y cableado, de caseta de inversores a subestación eléctrica, incluye, excavación, encofrado, registros, conexiones y pruebas. | 0 | 19/09/2023 | 19/10/2023 | Este proyecto esta en proceso de Rectificación | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 3 | 3767.57 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños | X | | | | \$6,037,150.00 | \$ - | \$6,037,150.00 | Salones de clase Sanitarios escalera y vestíbulo | 7 2 2 | 578.74 83.40 278.62 | Este proyecto esta en proceso de Rectificación | 1.- Preliminares a base de limpieza, trazo, revelación del terreno, y despalme. 2- Cimentación a base de zapatas corridas y contra traves de concreto armado. 3- Estructura conformada por columnas, muros, traves, losa de entripso, rampa para escalera y losa de azotea de concreto armado 4- Muros de tabique rojo recocido de 14 cms y 21 cms, aplanado fino y acabado con pintura vinilica. 5- Firme de concreto terminado con loseta de cerámica antiderrapante 6- Impermeabilización de azoteas terminadas con teja media caña. 7- Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural de 3" y 2", con cristal filtra sol de 6 mm, barandal metálico terminado con pintura anticorrosiva, mamparas de aluminio blanco de 2" en baños. 8- Instalación hidráulica-sanitaria y suministro y colocación de muebles de baño 9- Instalación eléctrica, voz, red de datos, suministro y colocación de lámparas led. 10- Obra exterior con la instalación del servicios de energía eléctrica, red de fibra óptica, red de agua potable, descarga de drenaje, captación de aguas pluviales, y andador de concreto hidráulico al edificio. | 0 | 19/09/23 | 19/12/23 | Este proyecto esta en proceso de Rectificación | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL | 11 | 940.76 | | | | | | | | | | | | |

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanta foto como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2023



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Marzo_2023
FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vicerector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadri@unsi.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsi.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Alcance del proyecto, Acciones que sustentan el avance, Acciones por realizar, % de avance, Fechas, Observaciones, and Obra Concluida sub-columns.

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Arq. Raquel López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo_2023

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


PRIMORDIAL 1 Nombre de la obra: **Terminación de la Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad, con cubierta de Paneles Solares**



Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

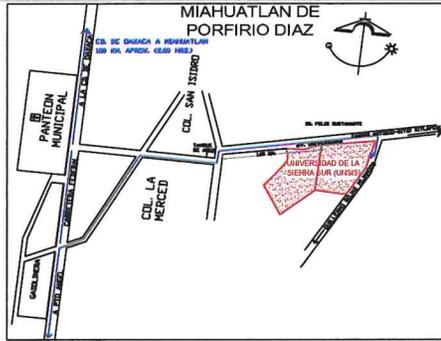

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Estacionamiento Vehicular



F2- Acceso Peatonal, Biciquetas y Motocicletas

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Terminación de la Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad, con cubierta de Paneles Solares.
Esta en proceso de Rectificación

- La fotografía muestra: F1- Estacionamiento Vehicular
- La fotoaafia muestra: F2- Acceso Peatonal. Biciquetas y Motocicletas
- La fotoaafia muestra: F3- Acceso Peatonal
- La fotoaafia muestra: F4- Estacionamiento Biciquetas
- La fotoaafia muestra: F5: Estacionamiento Motocicletas



F3- Acceso Peatonal



F4- Estacionamiento Biciquetas




F5- Estacionamiento Motocicletas

Lic. Erick Alexis Delos Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Arg. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras: Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Marzo_2023
FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRIMORDIA 2 Nombre de la obra: **Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

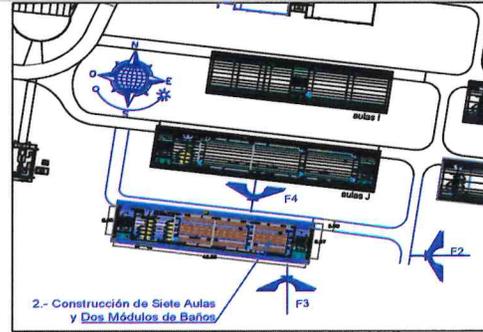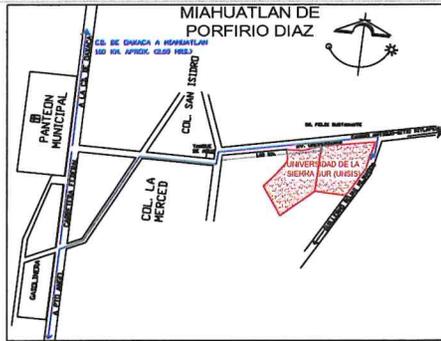

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Vista aerea del edificio



F2- Vista Este - Oeste



F3- Vista Sur - Norte



F4- Vista Oeste - Este

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños
esta en proceso de Rectificación

La fotografía muestra: F1- Vista aerea del edificio

La fotografía muestra: F2- Vista Este - Oeste

La fotografía muestra: F3- Vista Sur - Norte

La fotografía muestra: F4- Vista Oeste - Este

Lic. Erick Alexis Sánchez Valencia
Vice-rector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Ara. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado

Marzo_2023

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur



Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

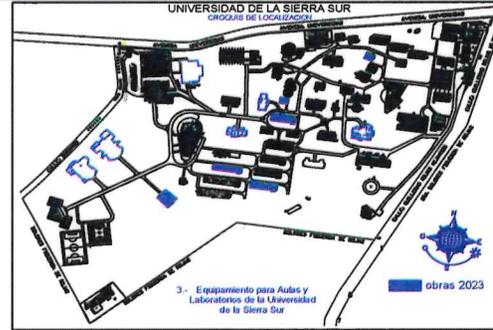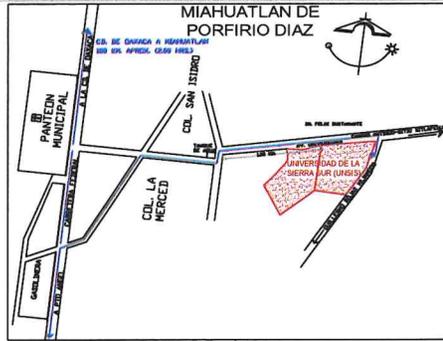

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- AULAS



F2- AULAS

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur
esta en proceso de Rectificación

Fotografía F1- AULAS

Fotografía F2- AULAS

Fotografía F3- AULAS

Fotografía F4- LABORATORIO DE COMPUTO

Fotografía F5- CENTRO DE INVESTIGACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION - ANTROPOMETRIA



F3- AULAS



F4- LABORATORIO DE COMPUTO



F5- CENTRO DE INVESTIGACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION - ANTROPOMETRIA

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Ato. Raquel Lopez Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo_2023

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRORIDAD

3

Nombre de la obra:

Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

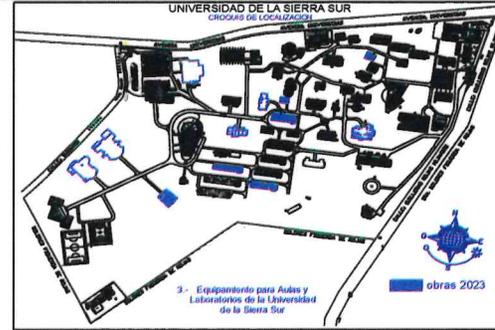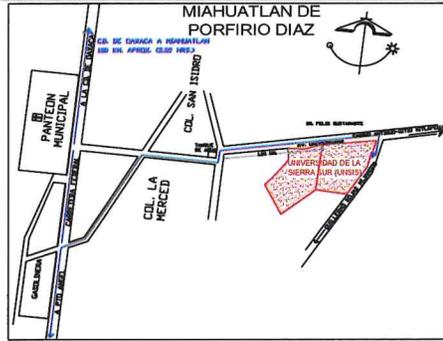

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.



Porcentaje de avance

0

FOTOS



F6- CLINICA ROBOTIZADA - SALA DE EXPULSION



F7- CLINICA ROBOTIZADA - UCIN

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur
esta en proceso de Rectificación

Fotografía F6- CLINICA ROBOTIZADA - SALA DE EXPULSION

Fotografía F7- CLINICA ROBOTIZADA - UCIN

Fotografía F8- CLINICA ROBOTIZADA - LABOR DE PARTO

Fotografía F9- CLINICA ROBOTIZADA - UCI

Fotografía F10: ODONTOLOGIA - CLINICA 1



F8- CLINICA ROBOTIZADA - LABOR DE PARTO



F9- CLINICA ROBOTIZADA - UCI



F10: ODONTOLOGIA - CLINICA 1

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Ara. Riquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo_2023

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0

PRICIDAD 3 Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

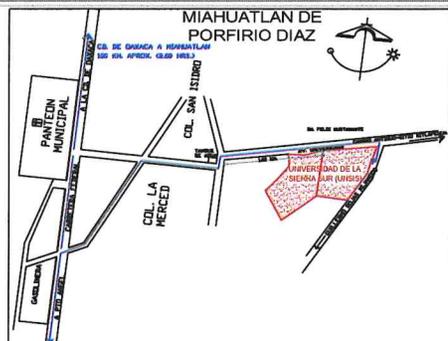

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F11- PATOLOGIA CLINICA- MICROBIOLOGIA



F12- ODONTOLOGIA - IMAGENOLOGIA

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur
esta en proceso de Rectificación

- Fotografía F11- PATOLOGIA CLINICA- MICROBIOLOGIA
- Fotografía F12- ODONTOLOGIA - IMAGENOLOGIA
- Fotografía F13- ANATOMIA-ANFITEATRO
- Fotografía F14- ANATOMIA-SALA DE MODELOS
- Fotografía F15:



F13- ANATOMIA-ANFITEATRO



F14- ANATOMIA-SALA DE MODELOS

F15:

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

Ara. Raquel Lopez Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
