2018



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Nes raportado

Noviembre_2018

RIPTIVO DEL IN		

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca

Clave Inst 911: 20MSU0023N

mbre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valend


largo: Vice - Rector de Administración eléfono: 01 951 57 2 41 00

ombre: Arq. Raquel López Salvador Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 307

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO OBRA CONCLUIDA

			and make make a				and the second second	***************************************										*******	***************************************	
		Tipo de proyec	to			Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1					Fechas ³			¿Es	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
Nombre del proyecto	Nombre del proyecto	Obra de continuidad Equipamiento fecuaciones y mejoras Mantenimiento	Monto autorizado autorizado		Remanente	Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados	Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance		Observaciones	susceptible de ser inaugurada? (Causas)	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró ?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrati va de Entrega- Recepción	Administra	
-						Proyectores de 3200	20		-	2. Ejercer el recurso de acuerdo a la	GLOBAL DEL PROYECTO		YECTO	<u> </u>	}					
						lúmenes Sillas de visitas	280			Ley de Adquisiciones vigente, siendo adjudicación, invitación o licitación										
						Mesa bancos	140		3 El fallo del	pública nacional, dependiendo de los										
						pizarron	5			montos a ejercer.										
	Equipamiento de infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.					Mesa de computo	50		Proceso de licitacio	on				Se solicito ante la DGESU, su autorizacion para el incremento de						
				***************************************		sistema de aire acondicionado de dos	4		de este proyecto,	Emitir el fallo y formalizar la compra a través de la firma de un contrato con	1			la meta, lo cual ya fue autorizado						
						toneladas	,		que lleva a cabo el	de el proveedor adjudicado.				mediante oficio No. 511-3/2018	1					
ŀ						Unidad dental G1 GNATUS	1	Adquisir	Adquisiciones se dio				0904, de fecha 05 de septiembre							
		x	\$ 4,136,432.27	· s -	\$ 4,136,432.27				el dia 04 de					de 2018., El fallo del Proceso de licitacion de este proyecto, que lleva						
						Unidad dental G3 NEW F GNATUS	13				0	01/10/18	8 31/12/18	a cabo el Comité Estatal de						
						Rayos X Corix 70 plus-USV-	2		estan formalizando especificadas os contratos con las su presas adjudicadas adjudicadas adjudicadas (SEP, SHCP, SCTG, SF)	especificadas 35 5. Dar seguimiento de las adquisiciones y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes				Adquisiciones se dio el día 04 de diciembre de 2018, actualmente se estan formælizando los contratos con las empresas adjudicadas.						
						WM	1													
						Estación de autopsia														
						Maquina para embalsamado	1													
						Mesa de disección 4	4													
						Sillas de visitas	184													
						estantes TOTAL	20 725	0.00												
						IOIAL	7.20	0.00		2 Fiercer el recurso de acuerdo a la	GLOBAL DEL PROYECTO	<i>i</i>		************				1		
, ,	lluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con làmparas ahorradoras de energía primera etapa.	3	X 5 346,400 85	\$	\$ 346,400.89	Lámparas ahorradoras de energía	20		Proceso de licitacion de este proyecto, que lleva a cabo el Comité Estatal de Adquisiciones se did- el dia 04 de diciembre de 2018, actualmente se estan formalizando los contratos con las empresas	3. Emitir el fallo y formalizar la compra a través de la firma de un contrato con el proveedor adjudicado. 4. Recibir el equipamiento y mobiliario adquirido e instalario en las áreas	0	01/10/18	29/11/18	Se solicito ante la DGESU, su autorización para el incremento de la meta, lo cual y a fue autorizado mediante dello no. 511-3/2018. 10094, de fecha DG de septembre de 2018, Efilato del Proceso de de 2018, Efilato del Proceso de la cabo el Comité Estatal de Adquisciones se del cel do 40 de del celembre de 2018, actualmente se estan formalizando las contratos con las empresas adjudicadas.	***************************************			·		
						TOTAL	20	0.00												
						IOIAL	24	0.00			GLOBAL DEL PROYECTO	ROYECTO						1	<u> </u>	
					e			ģ						1						
						TOTAL	0	0.00							ļ				ļ	





OAKACA

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MITTO.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra-o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos digitos: dd., mm y aa.

2018

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONALIDEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Noviembre 2018 FECHA DE CORTE

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Equipamiento de infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.



Porcentaje de avance



Nombre de la obra: *

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Comentarios de los trabajos realizados:

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO





Lic. Erick Alexis Oc Vicerector de Admin







Se solicito ante la DGESU, su autorizacion para el incremento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-3/2018.-0904, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualmente el proyecto se encuentra en proceso de autorizacion ante las instancias estatales correspondientes

La fotografia F1, muestra la fachada principal de 2 de los 4 modulos de aulas en las que se colocaran proyectores


La fotografia F2, muestra el interior del aula A1, que se equipara con proyectores La fotografia F3, muestra el interior del aula B1, que se equipara con proyectores La fotografia F4, muestra el interior del aula C1, que se equipara con proyectores La fotografia F5, muestra el interior del aula C2, que se equipara con proyectores


DEPTO. DE PROYECTOS

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la ob-



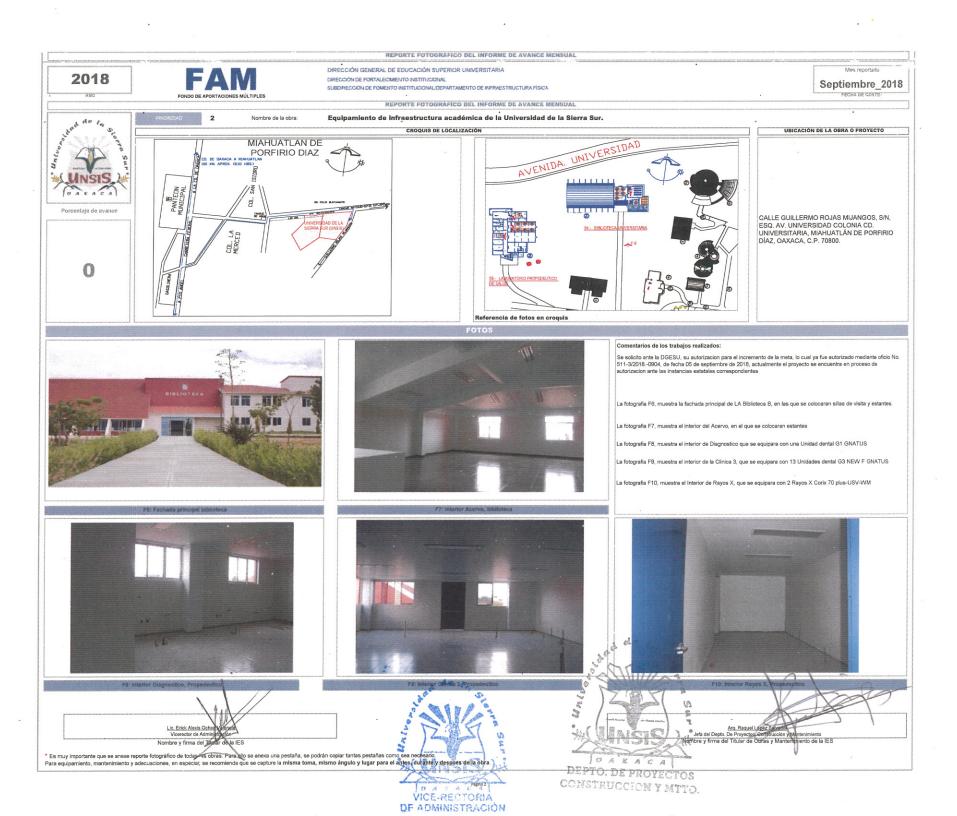

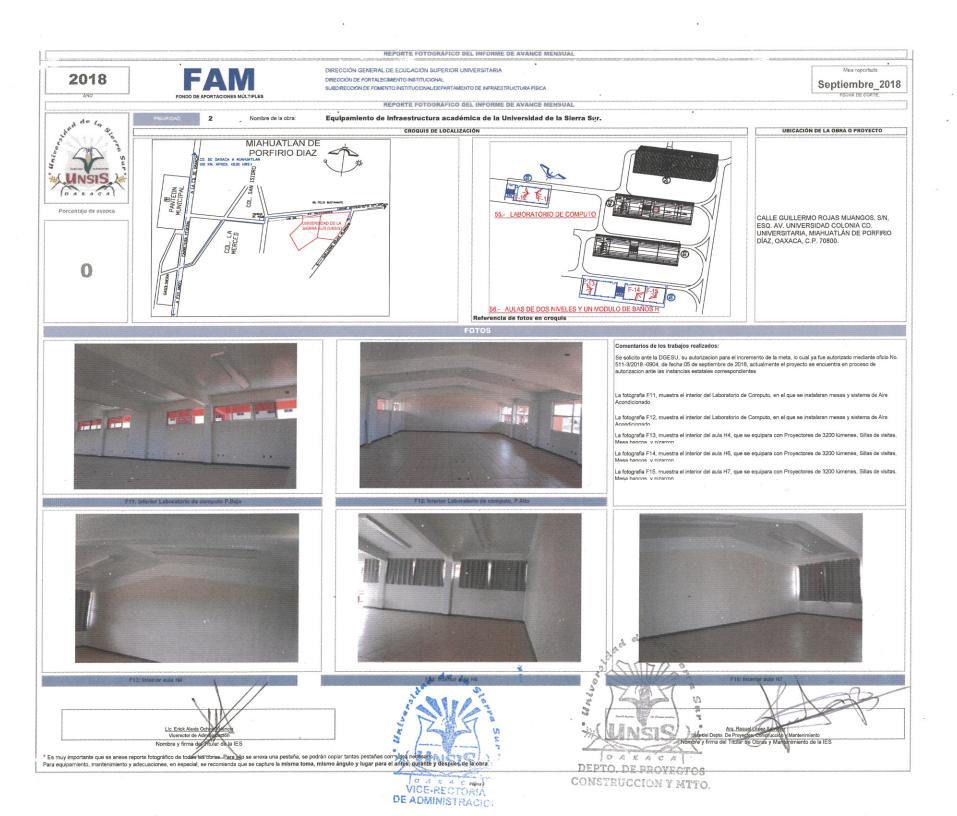



ESO. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.





Se solicito ante la DGESU, su autorizacion para el incremento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-3/2018.-0904, de fecha 05 de septiembre de 2018, actualmente el proyecto se encuentra en proceso de autorizacion ante las instancias estatales correspondientes

La fotografia F16, muestra la fachada principal del Laboratorio de Anatomia y Diseccion


La fotografia F17, muestra el interior del Area de Diseccion de Laboratorio de Anatomia, que se equipara con mesas de

La fotografia F18, muestra el interior del Area de Diseccion de Laboratorio de Anatomia, que se equipara con mesas de diseccion

La fotografia F19, muestra el interior del Anfiteatro, que se equipara con una Estación de autopsia, y Maquina para

La fotografia F20, muestra la fachada lateral Derecha del Laboratorio de Anatomia y Diseccion









Arg. Raquel Lépez Salvador lefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento ombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



DEPTO. DE PROYECTOS

CONSTRUCCION Y MTTO.

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓ 2018




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Noviembre_2018

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Porcentaje de avance



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.










Lic, Erick Alexis Ochso V Nombre y firma del Titular de la IES





VICE-RECTOR-DE ADMINISTRAC


Comentarios de los trabajos realizados:

Se solicito ante la DGESU, su autorizacion para el incremento de la meta, lo cual ya fue autorizado mediante oficio No. 511-3/2018-3/904, de fecha DS de septiembre de 2018, actualmente el proyecto se encuentra en proceso de autorizacion ante las instancias estatales correspondientes

La fotografia F1, el andador que se equipara con lamparas ahorradoras

La fotografia F2, el andador que se equipara con lamparas ahorradoras

La fotografia F3, el andador que se equipara con lamparas ahorradoras



DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MITO.
