

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca

Clave 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia

Cargo: Vice - Rector de Administración

Teléfono: 01 951 57 2 41 00

Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador

Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306

Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFAM, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, Espacios físicos/equipamiento, Acciones que sustentan el avance, Fechas Reales, Observaciones, Retiro a la TESOFE, Actas.



Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice rector de Administración
Universidad de la Sierra Sur



Mra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



1 Se capturara los espacios que sustentan a la obra...
2 En esta sección se reportan los espacios que sustentan a la obra...
3 Es importante que la fecha de inicio y termino estén actualizadas...

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca

Clave 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFAM, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA, Espacios físicos/equipamiento, Acciones que sustentan el avance, Fechas Reales, Observaciones, Reintegro a la TESOFE, Actas.

Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios, y área deportiva de la universidad de la sierra sur

3 5

X

10/10/24 17/02/25

\$

0%

10/10/24

Con fecha 24 de septiembre de 2024, se emitió el fallo del proceso de licitación, los contratos se formalizarán el 9 de octubre del presente año, a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca

\$9,977,187.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$9,977,187.00 TOTAL 229 0.00



Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice Rector de Administración
Universidad de la Sierra Sur



Mra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



1 Se capturan los datos que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFAM, Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución de la obra, Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Espacios físicos/equipamiento, Acciones que sustentan el avance, Fechas Reales, Observaciones, Reintegro a la TESOFE, Actas.



Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur



VICE RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Mtra. María de los Angeles Peralt Añas
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



RECTORIA

1 Se capturan los datos de avance de los proyectos de acuerdo a los reportes de avance que se reportan a la oficina de planeación y mto.
2 En esta sección se resume de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Tercer Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 04/10/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


0%

PRIMORDIAL 1 Nombre de la obra: Terminación del estacionamiento para bicicletas, motocicletas y automóviles para alumnos y personal de la universidad, equipado con cubierta de paneles solares y colocación de 96 paneles solares en la azotea del centro de odontología

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

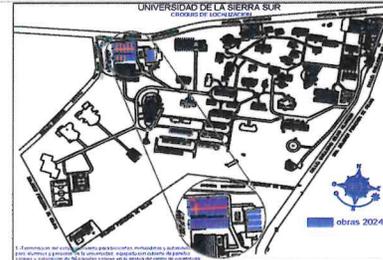

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, SN, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800

FOTOS



F2- Vista sur-norte del edificio



F3- Azotea del Centro de Odontología



F4- Vista Oeste - Este



F1- Vista Este - Oeste

Observaciones :

El proyecto: Terminación del estacionamiento para bicicletas, motocicletas y automóviles para alumnos y personal de la universidad, equipado con cubierta de paneles solares y colocación de 96 paneles solares en la azotea del centro de odontología

Actualmente el proyecto está en la etapa de Dictaminación del proceso de Licitación Pública Nacional por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca

- La fotografía muestra: F2- Vista sur-norte del edificio
- La fotografía muestra: F3- Azotea del Centro de Odontología
- La fotografía muestra: F4- Vista Oeste - Este
- La fotografía muestra: F1- Vista Este - Oeste
- La fotografía muestra: F5-



F5-

OBRAS

Ara, Raquel López Salazar
Coordinadora de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACION

Lic. Erick Alexis Ochoa Velasco
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2024

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Tercer Trimestre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

5,400.00

Fecha de elaboración: 04/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800



Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1- Centro de Investigación en Nutrición y alimentación (CINA) Laboratorio de antropometría



F2- Hospital Robotizado (HROB) Hospitalización



F3- Centro de Odontología (CEODON) Clínica Dental 2



F4- Centro de Odontología (CEODON) Imagenología

Observaciones:

El proyecto: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Sierra Sur. Con fecha 24 de septiembre de 2024, se emitió el fallo del proceso de licitación, los contratos se formalizaron el 9 de octubre del presente año, a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca

- La fotografía muestra: F1- Centro de Investigación en Nutrición y alimentación (CINA) Laboratorio de antropometría
- La fotografía muestra: F2- Hospital Robotizado (HROB) Hospitalización
- La fotografía muestra: F3- Centro de Odontología (CEODON) Clínica Dental 2
- La fotografía muestra: F4- Centro de Odontología (CEODON) Imagenología

UNSI
VICERECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
Lic. Raquel López Salvador
Vice Directora de Planeación y Mantenimiento

PLANEACIÓN
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR
Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



* Es muy importante que se anexe el reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y reparaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTTG

2024

PERIODO FISCAL EN EL QUE OTORGAR EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

5,400.00

Trimestre y año que se reporta

Tercer Trimestre 2024


Fecha de elaboración: 04/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRORIDAD 3

Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

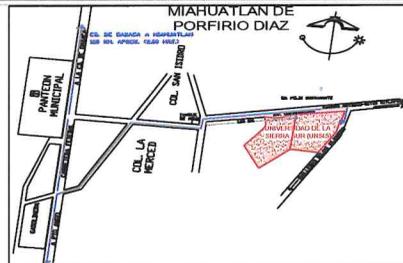

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800



Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F6- Centro de Odontología (CEODON) Clinica Dental 1



F7- Centro de Tecnologías de la Información (CETI) Lab. Desarrollo de Software



F8- Centro Cultural y Deportivo (Gimnasio)



F9- Sala de Computo 6

Observaciones :

El proyecto: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur
Con fecha 24 de septiembre de 2024, se emitió el fallo del proceso de licitación, los contratos se formalizaran el 9 de octubre el presente año, a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca

- La fotografía muestra: F6- Centro de Odontología (CEODON) Clinica Dental 1
- La fotografía muestra: F7- Centro de Tecnologías de la Información (CETI) Lab. Desarrollo de Software
- La fotografía muestra: F8- Centro Cultural y Deportivo (Gimnasio)
- La fotografía muestra: F9- Sala de Computo 5
- La fotografía muestra: F10:

UNSI OBRAS
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR
Mtra. María de los Angeles Peralta Atlas
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento de aulas, laboratorios, y áreas deportivas se captura la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

5,400.00

Trimestre y año que se reporta

Tercer Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 04/10/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD: P.N. 4 Nombre de la obra: Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios, y área deportiva de la universidad de la sierra sur (complemento)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800



Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1- Sala de Computo 1



F2- Sala de Computo 3

Observaciones :

El proyecto: Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios, y área deportiva de la sierra sur (complemento)

Con fecha 24 de septiembre de 2024, se emitió el fallo del proceso de licitación, los contratos se formalizaron el 9 de octubre del presente año, a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca

- La fotografía muestra: F1- Sala de Computo 1
- La fotografía muestra: F2- Sala de Computo 3
- La fotografía muestra: F3- Sala de Computo 4
- La fotografía muestra: F4- Sala de Computo 2
- La fotografía muestra:



F3- Sala de Computo 4



F4- Sala de Computo 2

UNSI
Ases. Resp. de Seguimiento
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTTO.

PLANEACIÓN

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Viceirector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
