

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFAM, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado), Fechas Reales, Observaciones, Reintegro a la TESOFE, Actas.

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice Rector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

Mtra. María de los Angeles Perilla Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca

Clave 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia

Cargo: Vice - Rector de Administración

Teléfono: 01 951 57 2 41 00

Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador

Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306

Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, Espacios físicos/equipamiento, Fechas Reales, Observaciones, Reintegro a la TESOFE, Actas. Includes project details for equipment in classrooms and computer labs.

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice Rector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se ven reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO

VICE RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

RECTORIA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavane17@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFAM, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA, Espacios físicos/equipamiento, Fechas Reales, Observaciones, Reintegro a la TESOFE, Actas. Includes project details for computer equipment and gymnasium.

Signature and stamp of Arq. Raquel López Salvador, Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento, Universidad de la Sierra Sur.

Signature and stamp of Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia, Vice Rector de Administración, Universidad de la Sierra Sur.

Signature and stamp of Mtra. María de los Angeles Peraza Arias, Rectora, Universidad de la Sierra Sur.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


10%

Nombre de la obra: **Terminación del estacionamiento para bicicletas, motocicletas y automóviles para alumnos y personal de la universidad, equipado con cubierta de paneles solares y colocación de 96 paneles solares en la azotea del centro de odontología**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

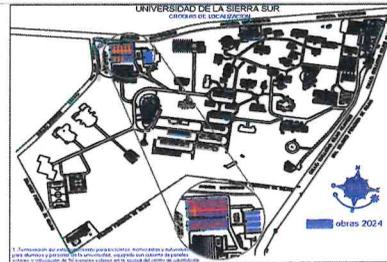

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Terminación del estacionamiento para bicicletas, motocicletas y automóviles para alumnos y personal de la universidad, equipado con cubierta de paneles solares y colocación de 96 paneles solares en la azotea del centro de odontología.
Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P.70800

FOTOS



F2- Placas metálicas para recibir estructura



F3- Azotea del Centro de Odontología

Observaciones :
El proyecto: Terminación del estacionamiento para bicicletas, motocicletas y automóviles para alumnos y personal de la universidad, equipado con cubierta de paneles solares y colocación de 96 paneles solares en la azotea del centro de odontología

De este proyecto contamos con una fianza de anticipo, fianza de cumplimiento, el suministro de los paneles, y se esta realizando la estructura para recibir los paneles solares

La fotografía muestra: F2- Placas metálicas para recibir estructura
La fotografía muestra: F3- Azotea del Centro de Odontología
La fotografía muestra: F4- estructura metálica para recibir paneles
La fotografía muestra: F1- suministro de paneles solares
La fotografía muestra: F5- insumos para la estructura metálica



F4- estructura metálica para recibir paneles



F1- suministro de paneles solares



F5- insumos para la estructura metálica

OBRAS
Ara. Rafael López Salvador,
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN
Lic. Erick Alexis Cochoa Valencia
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR
Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se pueden colocar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2024

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Cuarto Trimestre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

5,400.00

Fecha de elaboración:09/01/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO 3 Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P:70800



Porcentaje de avance

85%

FOTOS



F6- Centro de Odontología (CEODON) Clínica Dental 1 (AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETT)



F7- Centro de Tecnologías de la Información (CETI) Lab. Desarrollo de Software

Observaciones:

El proyecto: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Sierra Sur Con fecha 24 de septiembre de 2024, se emitió el fallo del proceso de licitación, los contratos se formalizarán el 9 de octubre del presente año, a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca

- La fotografía muestra: F6- Centro de Odontología (CEODON) Clínica Dental 1 (AIRE ACONDICIONADO TIPO CASETT)
- La fotografía muestra: F7- Centro de Tecnologías de la Información (CETI) Lab. Desarrollo de Software
- La fotografía muestra: F8- Centro Cultural y Deportivo (Gimnasio)
- La fotografía muestra: F9- Sala de Computo 5
- La fotografía muestra: F10: sala de software dental (ODONTOLOGIA)



F8- Centro Cultural y Deportivo (Gimnasio)



F9- Sala de Computo 6



F10: sala de software dental (ODONTOLOGIA)

OBRAS

Agü. Basuril López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO



2024

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Cuarto Trimestre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

5,400.00

Fecha de elaboración: 09/01/2025


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

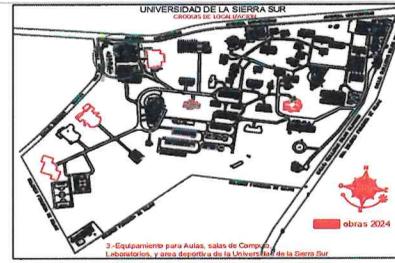

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.:70800




Porcentaje de avance

85%

FOTOS



F1- Centro de Investigación en Nutrición y alimentación (CINA) Laboratorio de antropometría (PARRILLA DE AGITACIÓN)



F2- Hospital Robotizado (HROB) Hospitalización (MANIQUÍ DE RCP CON LUZ, TORSO DE AUSCULTACIÓN MASCULINO)

Observaciones:

El proyecto: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur. Con fecha 24 de septiembre de 2024, se emitió el fallo del proceso de licitación, los contratos se formalizaron el 9 de octubre del presente año, a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.

- La fotografía muestra: F1- Centro de Investigación en Nutrición y alimentación (CINA) Laboratorio de antropometría (PARRILLA DE AGITACIÓN)
- La fotografía muestra: F2- Hospital Robotizado (HROB) Hospitalización (MANIQUÍ DE RCP CON LUZ, TORSO DE AUSCULTACIÓN MASCULINO)
- La fotografía muestra: F3- Centro de Odontología (CEODON) Clínica Dental 2
- La fotografía muestra: F4- Centro de Odontología (CEODON) Imagenología
- La fotografía muestra: F5- Patología - Sala de computo



F3- Centro de Odontología (CEODON) Clínica Dental 2



F4- Centro de Odontología (CEODON) Imagenología



F5- Patología - Sala de computo

OBRAS

Arq. Manuel López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicepresidente de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

UNSI
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

UNSI
VICE RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

UNSI
RECTORIA

2024

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Cuarto Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 09/10/2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

5,400.00

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

P.R. 4 Nombre de la obra: Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios, y área deportiva de la universidad de la sierra sur (complemento)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P:70800



Porcentaje de avance

75%

FOTOS



F1- Sala de Computo 1



F2- Sala de Computo 3

Observaciones:

El proyecto: Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios, y área deportiva de la universidad de la sierra sur (complemento)

Con fecha 24 de septiembre de 2024, se emitió el fallo del proceso de licitación, los contratos se formalizaron el 9 de octubre del presente año, a través del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca

- La fotografía muestra: F1- Sala de Computo 1
- La fotografía muestra: F2- Sala de Computo 3
- La fotografía muestra: F3- UCI - Hospital Robotizado
- La fotografía muestra: F4- Sala de Computo 2
- La fotografía muestra: F5- Gimnasio



F3- UCI - Hospital Robotizado



F4- Sala de Computo 2



F5- Gimnasio

OBRAS

Ara, Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mra. María de los Angeles Peralt y Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

UNSI
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

