

2025

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 03/04/2025

UNISIS

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave 911: 20MSU0023N

Planeación
Nombre: L.C.E. Rafael Villagómez Macías
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: rafavmacias@gmail.com y vice_admin@unsis.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: salvadorr12.77@gmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | ID de acuerdo con el SIFA | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | Monto autorizado (A) | CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | | | Monto ejercido (D) | Remanente (E) = B-D | Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado) | | | Acciones que sustentan el avance | % de avance | Fechas Reales | | Observaciones | Reintegro a la TESOFE | | | Actas | | |
|-----------|---------------------------|--|------------------|----------------------|---|--------------------|---------|----------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---|--|--|--|---------------------|------------------|---|---------------|-----------------------|---------|--|-------|---|-------|
| | | | | | No. (s) de Contrato (s) | Fechas Programadas | | Monto Contratado (B) | Contratista | | | Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B | Nombre del Espacio/equipo | Cantidad | | | Metros Cuadrados | Línea de Captur | | Fecha de pago | Importe | Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO | Fecha | Acta Administrativo de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO | Fecha |
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños | X | \$1,630,851.73 | 26/06/25 | 31/12/25 | \$ - | \$ - | \$ 1,630,851.73 | \$ - | \$ - | Salones de clases | 7 | 579.37 | 1. Preliminares a base de limpieza, trazo, nivelación del terreno, y despalme. 2. Cementación a base de zapatas corridas y contra trabes de concreto armado. 3. Estructura conformada por columnas, muros, trabes, losa de entrepiso, rampa para escalera y losa de azotea de concreto armado. 4. Muros de tabique rojo recocido de 14 cms y 21 cms, aplastado fino y acabado con pintura vinílica. 5. Firme de concreto terminado con loseta de cerámica antideslizante. 6. Impermeabilización de azoteas terminadas con teja media caña. 7. Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural de 3" y 2", con cristal filtra sol de 6 mm, barandal metálico terminado con pintura anticorrosiva, mamparas de aluminio blanco de 2" en baños. 8. Instalación hidráulica-sanitaria, suministro y colocación de muebles de baño. 9. Instalación eléctrica, voz, red de datos, suministro y colocación de lámparas led, contactos y apagadores. 10. Obra exterior con la instalación del servicios de energía eléctrica, red de fibra óptica, red de agua potable, descarga de drenaje, captación de aguas pluviales, y andador de concreto hidráulico al edificio. | GLOBAL DEL PROYECTO | 0% | Los proyectos están en proceso de rectificación | | | | | | | |
| | | | | \$1,630,851.73 | | | \$0.00 | | \$1,630,851.73 | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL | 11 | 940.76 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios y comedor de la Universidad de la Sierra Sur | X | \$ 3,386,243.83 | 26/06/25 | 31/12/25 | \$ - | \$ - | \$ 3,386,243.83 | \$ - | \$ - | Video proyector de 4000 lúmenes Pizarrón porcelanizado de 4.5 x 1.2 mts compu. de escritorio, procesador i5, 8 GB RAM, 512 GB, con monitor servidor QNAP compu. de escritorio, procesador i9 con tarjeta gráfica dedicada y monitor mini split con capacidad de 24000 BTU/H consola de mezcla de audio de 12 canales amplificador de 2 canales Unidad Dental Bomba de vacío Articulador ajustable Robot Portatil Dental Microscopio odontológico detector de caries con luz laser fluorescente 1 Analizador de Química seca 1 Analizador de Hematología 1 lector de tiras de orina 1 Equipo de Tiempos de Coagulación 1 Analizador de Inmunofluorescencia 1 autoclave de 24L 5 Esteroscopios Microscopio de Epifluorescencia Procesador de tejidos Microtomo Estacion de inclusion de parafina Baño de flotación | 7 7 50 1 48 4 1 1 18 16 18 8 1 2 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 | AULAS MODULO L SALA DE COMPUTO 9-10 CENTRO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN (CETI) CEODON - Lab. de Simulación CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA- Lab. Bioquímica CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA- Lab. de Histología | 1.- Compra, suministro y colocación de equipo en los salones de clases del Modulo L: con 7 Videopro yector de 4000 lúmenes, y 7 Pizarrón porcelanizado de 4.5 x 1.2 mts. 2.- Compra, suministro y colocacion de equipos en las siguientes Salas de computo., en la Sala de cómputo 9: 25 computadora de escritorio, procesador i5, 8 GB RAM, 512 GB, con monitor., en la Sala de cómputo 10: 25 computadora de escritorio, procesador i5, 8 GB RAM, 512 GB, con monitor 3.- Compra, suministro y colocacion de equipo en el Centro de Tecnologías de la Información (CETI), en el Laboratorio de Tecnologías Web: con 1 servidor QNAP, 48 computadora de escritorio, procesador i9 con tarjeta gráfica dedicada y monitor, 4mini split con capacidad de 24000 BTU/H , 1 consola de mezcla de audio de 12 canales, 1 amplificador de 2 canales 4.- Compra, suministro y colocación de equipo en el Centro de Odontología (CEODON), en las siguientes áreas, Clínica Dental 3; con 18 Unidad Dental, y 18 Bombas de vacío; Laboratorio de Materiales Dentales: con 18 Articulador ajustable, 8 Microscopio dental Ecleris; el Laboratorio de Simulación con 1 Microscopio odontológico, y 2 detector de caries con luz laser fluorescente | GLOBAL DEL PROYECTO | 0% | Los proyectos están en proceso de rectificación | | | | | | | |

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
UNISIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS

L.C.E. Rafael Villagómez Macías
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur
RECTORÍA

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o provento. Se podrán anotar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos; dd, mm y aa.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca

Clave 911: 20MSU0023N

Nombre: L.C.E. Rafael Villagómez Macías

Cargo: Vice - Rector de Administración

Teléfono: 01 951 57 2 41 00

Correo electrónico: rafavmacias@gmail.com y vice_admin@unsis.edu.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Raquel López Salvador

Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306

Correo electrónico: salvadorlr12.77@gmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

[illegible]

Arq. Raquel López Salvador

Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

L.C.E. Rafael Villagómez Macías

Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias

Rectora
Universidad de la Sierra Sur

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO

VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL**DATOS DE LA UNIVERSIDAD**

Nombre: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca

Clave 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: L.C.E. Rafael Villagómez Macías

Cargo: Vice - Rector de Administración

Teléfono: 01 951 57 2 41 00

Correo electrónico: rafavmacias@gmail.com y vice_admin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador

Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306

Correo electrónico: salvadorlr12.77@gmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

[illegible]

Arg. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

L.C.E. Rafael Villagómez Macías
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



UNSI
DAXACA

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO

7. Instalación de 2" y 4", in
Instalación 1
mm.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 03/04/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca

Clave 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: L.C.E. Rafael Villagómez Macías

Cargo: Vice - Rector de Administración

Teléfono: 01 951 57 2 41 00

Correo electrónico: rafavmacias@gmail.com y vice_admin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador

Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306

Correo electrónico: salvadorlr12.77@gmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | ID de acuerdo con el SIFA | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | Monto autorizado (A) | CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | | | Monto ejercido (D) | Remanente (E) =B-D | Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado) | | | Acciones que sustentan el avance | % de avance | Fechas Reales | | Observaciones | Reintegro a la TESOFE | | | Actas | | | |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|---|--------------------|---------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|---|---------------------------|----------|----------------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------|--|-------|---|-------|--|
| | | | | | No. (s) de Contrato (s) | Fechas Programadas | | Monto Contratado (B) | Contratista | | | Monto no Contratado(C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B | Nombre del Espacio/equipo | Cantidad | | | Metros Cuadrados | Línea de Captura | | Fecha de pago | Importe | Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO | Fecha | Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO | Fecha | |
| | | | | | | INICIO | TÉRMINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | Ampliación del Comedor Universitario | X | | 26/06/25 | 31/12/25 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | | | | | | | | | | |
| | | | | \$1,547,285.05 | | | | \$0.00 | | \$1,547,285.05 | \$0.00 | | | TOTAL | \$10.00 | \$1,009.22 | | | | | | | | | | |
| | | | | \$10,407,196.49 | | | | \$0.00 | | \$10,407,196.49 | \$0.00 | | | TOTAL | \$434.00 | \$4,086.20 | | | | | | | | | | |

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur



DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.

L.C.E. Rafael Villagómez Macías
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur



VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



- 1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 03/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


0%

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



1.- Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA.



1.- Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños

FOTOS



F1- Vista aérea del edificio



F2- Vista Este - Oeste



F3- Vista Sur - Norte



F4- Vista Norte - Sur

Observaciones :

El proyecto: Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños

esta terminado

La fotografía muestra: F1- Vista aérea del edificio

La fotografía muestra: F2- Vista Este - Oeste

La fotografía muestra: F3- Vista Sur - Norte

La fotografía muestra: F4- Vista Norte - Sur

La fotografía muestra: F5- Inversores

NOTA:

* Es muy importante que se anexe el reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una foto a cada una de las obras, se puede incluir tantas fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se anexe la misma foto, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

OBRA
Ara. Rafael López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANIFICACIÓN

L.C.E. Rafael Villalobos Macías
Vicepresidente de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTTO.

VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

UNSI
RECTORÍA

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 05/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0%

PRIMORDIAL 2

Nombre de la obra: Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios y comedor de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



2.- Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios y comedor de la Universidad de la Sierra Sur

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



2.- Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios y comedor de la Universidad de la Sierra Sur

Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800

FOTOS



F1- Centro de Tecnologías de la Información (CETI) - Tecnologías Web



F2- Centro de Odontología (CEODON) - Laboratorio de Materiales Dentales 1



F3- Centro de Odontología (CEODON) - Clínica Dental 3



F4- Centro de Odontología (CEODON) - Laboratorio de Simulación



F5- Centro de Patología Clínica - laboratorio de Bioquímica

Observaciones :

El proyecto: Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios y comedor de la Universidad de la Sierra Sur esta en proceso de Rectificación

La fotografía muestra: F1- Centro de Tecnologías de la Información (CETI) - Tecnologías Web
La fotografía muestra: F2- Centro de Odontología (CEODON) - Laboratorio de Materiales Dentales 1
La fotografía muestra: F3- Centro de Odontología (CEODON) - Clínica Dental 3
La fotografía muestra: F4- Centro de Odontología (CEODON) - Laboratorio de Simulación
La fotografía muestra: F5- Centro de Patología Clínica - laboratorio de Bioquímica

OBRAS

Ato. Rafael López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

L.C.E. Rafael Villagómez Macías
Vicerrector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa a la presente, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma foto, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTTO.

VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 03/04/2025


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios y comedor de la Universidad de la Sierra Sur

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



2.- Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios y comedor de la Universidad de la Sierra Sur



2.- Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios y comedor de la Universidad de la Sierra Sur
Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800



F6- Centro de Patología Clínica - laboratorio de Histología



F7- Centro de Investigacion en Nutricion y alimentacion (CINA) - Lab. de Bromatologia

El proyecto: Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios y comedor de la Universidad de la Sierra Sur
esta en proceso de Rectificación

La fotografía muestra: F6: Centro de Patología Clínica - laboratorio de Histología
La fotografía muestra: F7: Centro de Investigación en Nutrición y alimentación (CINA) - Lab. de Bromatología
La fotografía muestra: F8: Hospital Robotizado (HROB) - Hospitalización
La fotografía muestra: F9: Hospital Robotizado (HROB) - Sala de Expulsión
La fotografía muestra: F10: Hospital Robotizado (HROB) - Unidad de Cuidados Intensivos



F8- Hospital Robotizado (HROB) - Hospitalización



F9- Hospital Robotizado (HROB) - Sala de Expulsión



F10: Hospital Robotizado (HROB) - Unidad de Cuidados Intensivos

Arq. Raquel López Salvador
 e. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento,
 Universidad de la Sierra Sur

L.C.E. Rafael Villagómez Macías
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

Mira, María de los Ángeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postaja, se ponen en copias las postajas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda el antes, durante y después de las obras, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

CONSTRUCCIÓN Y MTTO.

a obra. **VÍCE-RECTORÍA**
DE ADMINISTRACIÓN

2025

EFERICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 03/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO

2

Nombre de la obra: Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios y comedor de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

2.- Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios y comedor de la Universidad de la Sierra Sur

Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P:70800

FOTOS

F6- Centro de Anatomía y Disección (CAD) - Laboratorio de Modelos

F7- Comedor Universitario - F1- Vista aerea del edificio

F8- Sala de computo 9-10

F9- Aulas L

F10:

Observaciones :

El proyecto: Equipamiento para aulas, salas de computo, laboratorios y comedor de la Universidad de la Sierra Sur esta en proceso de Rectificación

La fotografia muestra: F6- Centro de Anatomía y Disección (CAD) - Laboratorio de Modelos

La fotografia muestra: F7- Comedor Universitario - F1- Vista aerea del edificio

La fotografia muestra: F8- Sala de computo 9-10

La fotografia muestra: F9- Aulas L

La fotografia muestra: F10:

OBRAS

Aro, Rosalva López-Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

L.C.E. Rafael Villalaz-Medina
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mtra. María de los Angeles Parra Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se debe capturar la imagen antes, durante y despues de la obra. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo lugar y momento antes, durante y despues de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 03/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0%

PRIMARÍA 3 Nombre de la obra: Construcción del Centro de Simulación Médica


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUÑANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70800

FOTOS



F1- Vista aerea del edificio



F2- Vista Noreste



F3- Vista Norte - Sur



F4- Vista sur

Observaciones :

El proyecto: Construcción del Centro de Simulación Médica

Proyecto en proceso de Rectificación

La fotografía muestra: F1- Vista aerea del edificio

La fotografía muestra: F2- Vista Noreste

La fotografía muestra: F3- Vista Norte - Sur

La fotografía muestra: F4- Vista sur

La fotografía muestra: F5-

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa el reporte fotográfico en formato digital (PDF) y se anexa el reporte fotográfico en formato físico (Fotografía impresa) como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTO.

VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 03/04/2025


REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMERIA


4

Nombre de la obra: Construcción de Cuatro Salas de Computo


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

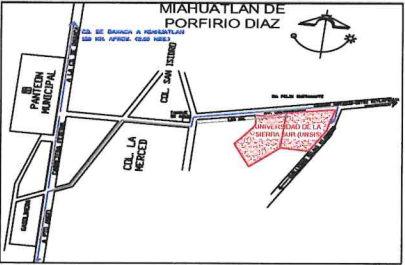

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

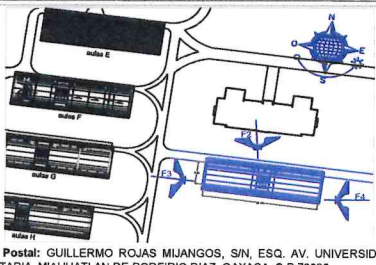


Porcentaje de avance


0%

Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800


FOTOS




F1- Vista aerea del edificio




F2- Vista Norte -Sur



F3- Vista Oeste -Este



F4- Vista Este - Oeste



F5-

Observaciones :

El proyeto: Construcción de Cuatro Salas de Computo

esta en proceso de Rectificación

La fotografia muestra: F1- Vista aerea del edificio

La fotografia muestra: F2- Vista Norte -Sur

La fotografia muestra: F3- Vista Oeste - Este

La fotografia muestra: F4- Vista Este - Oeste

La fotografia muestra: F5-

OBRAS

Aro, Raquel López Salvador

Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

L.C.E. Rafael Villagómez Macías

Vicerecotor de Administración

Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mtra. Maria de los Angeles Parilla Arias

Rectora

Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se agda un plan de trabajo que contenga los puntos de captación de las fotos como sea necesario. Para equipariento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma foto, mismo lugar y lugar para el antes, durante y despues de la obra

DEPTO. DE PROYECTOS

CONSTRUCCIÓN Y MTO.

VICE-RECTORIA

DE ADMINISTRACIÓN

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:


Primer Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 03/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO 5 Nombre de la obra: Ampliación del Comedor Universitario

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

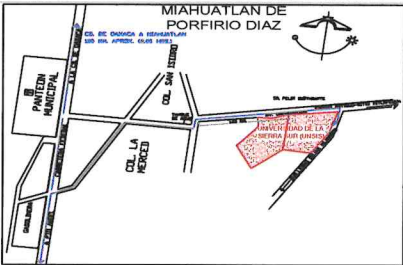

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1- Vista aerea del edificio



F2- Vista Oeste - este



F3- Vista Sur - Norte



F4- Vista Oeste - este

Observaciones :

El proyecto: Ampliación del Comedor Universitario
se encuentra en proceso de Rectificación

La fotografia muestra: F1- Vista aerea del edificio
La fotografia muestra: F2- Vista Oeste - este
La fotografia muestra: F3- Vista Sur - Norte
La fotografia muestra: F4- Vista Oeste - este
La fotografia muestra: F5- Vista Suroeste



F5- Vista Suroeste

OBRAS
Ara. Raquel Lopez Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN
L.C.E. Rafael Villalobos Macias
Vicerrector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR
Mtra. Maria de los Angeles Peraltas Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una lista de verificación, se podrán omitir algunas fotografías como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capturen fotografías antes, durante y después de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTTO.

VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN
