



Nombre: **Universidad de la Sierra Sur**  
Entidad Federativa: **Oaxaca**  
Carrera: **1111 - 230610023N**

Nombre: **LCE Enay Alexis Ortíz Valencia**  
Cargo: **Vice-Rector de Administración**  
Teléfono: **01 951 57 2 41 00**  
Correo electrónico: **abeov16@gmail.com** y **vadrin@uniss.edu.mx**

Nombre: **Arc. Roguail López Salazar**  
Cargo: **Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento**  
Teléfono: **01 951 57 2 41 00, ext. 1308**  
Correo electrónico: **zharand77@gmail.com** y **vastador@uniss.edu.mx**

Obras y Mantenimiento

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1			Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar	% de avance	Fechas 3		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Causas)	Si ya fue inaugurado ¿Cuenta con fotos con el momento de los eventos?	¿Quién y cuándo se inauguró (Fecha)?	Entrega- Recepción (Ingreso- Egreso)	Cuenta con Actas Administrativas de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa			
		Otra de construcción	Equipo	Acercamientos y mejoras				Mantenimiento	Inicio	Término															
2	Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.	X			\$ 1,679,470.00	\$ 1,679,470.00		7	158.49		El proyecto se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias establecidas correspondientes.	2. Ejecutar el recurso de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Inversión o Licitación pública nacional, dependiendo de los montos a ejercer. 3. Emitir el fidejocomiso y formalizar el contrato de obra pública con la empresa a la que se adjudicó el proyecto. 4. Comenzar la ejecución del proyecto, cuidando la inversión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 6. Finalizar el proyecto, cuidando la inversión de obra correspondiente.	GLOBAL DEL PROYECTO	0	17/05/19	30/10/19	El proyecto se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias establecidas correspondientes.								
3	Sistema de acceso y seguridad a la UNISIS	X			\$ 470,825.00	\$ 470,825.00		1	20.00		Se cuenta con el oficio de autorización, se están realizando los trabajos de licitación del expediente, para iniciar el proceso de licitación.	2. Ejecutar el recurso de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Inversión o Licitación pública nacional, dependiendo de los montos a ejercer. 3. Emitir el fidejocomiso y formalizar el contrato de obra pública con la empresa a la que se adjudicó el proyecto, cuidando la inversión de obra correspondiente. 4. Comenzar la ejecución del proyecto, cuidando la inversión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 6. Finalizar el proyecto, cuidando la inversión de obra correspondiente.	GLOBAL DEL PROYECTO	0	17/05/19	17/09/19	El proyecto se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias establecidas correspondientes.								
4	Ampliación del Almacén de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.	X			\$ 2,370,497.00	\$ 2,370,497.00		1	164.22		El proyecto se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias establecidas correspondientes.	2. Ejecutar el recurso de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Inversión o Licitación pública nacional, dependiendo de los montos a ejercer. 3. Emitir el fidejocomiso y formalizar el contrato de obra pública con la empresa a la que se adjudicó el proyecto. 4. Comenzar la ejecución del proyecto, cuidando la inversión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 6. Finalizar el proyecto, cuidando la inversión de obra correspondiente.	GLOBAL DEL PROYECTO	0	10/06/19	15/12/19	El proyecto se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias establecidas correspondientes.								
TOTAL								13	30.00																
Atención de servicios (mantenimiento, pintura y mantenimiento)								1	164.22																
TOTAL								14	164.22																

Nombre y Firma del Titular de la Obra y Mantenimiento de la SES  
  
Arc. Roguail López Salazar  
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Nombre y Firma del Titular de la SES  
  
LCE Enay Alexis Ortíz Valencia  
Vice-Rector de Administración



DEPTO. DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MTTO.



2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Más reportado  
Abril\_2019  
FECHA DE DORTE

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PROYECTO

2 Nombre de la obra: Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

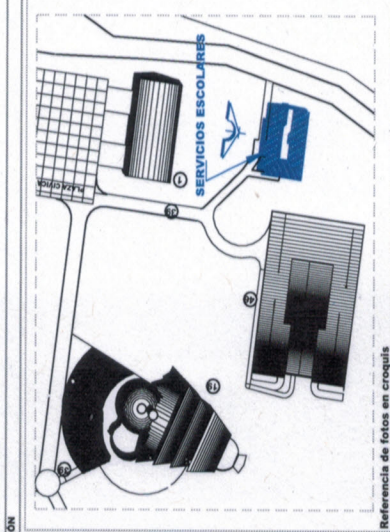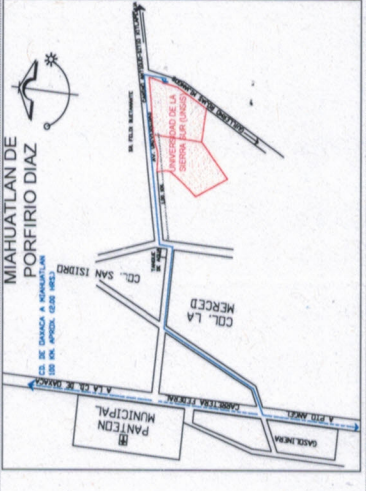

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Porcentaje de avance

0

CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N,  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO  
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Referencia de fotos en croquis


FOTOS



F1: Edificio de servicios escolares



F2: Aglomeración de estudiantes en el Departamento de Servicios Escolares

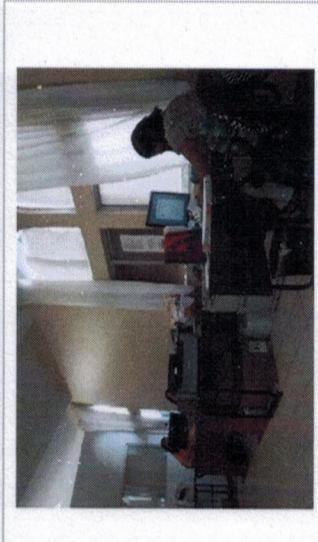

F3: Interior Edificio de servicios escolares



F4: Vista posterior Edificio de servicios escolares

Comentarios de los trabajos realizados:  
El proyecto "Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F1, muestra el Edificio de servicios escolares  
La fotografía F2, muestra la Aglomeración de estudiantes en el Departamento de Servicios Escolares  
La fotografía F3, muestra Interior del edificio de servicios escolares  
La fotografía F4, muestra Vista posterior del Edificio de servicios escolares

Lic. Erick Arce Cruz  
Nombre y firma del Titular de la IES

Dr. Rafael López Salazar  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postalita, se podrán observar fundas, pedruzcos, cómo sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, misma ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
Abril 2019  
FECHA DE REPORTE

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance



0

3

Nombre de la obra:

Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

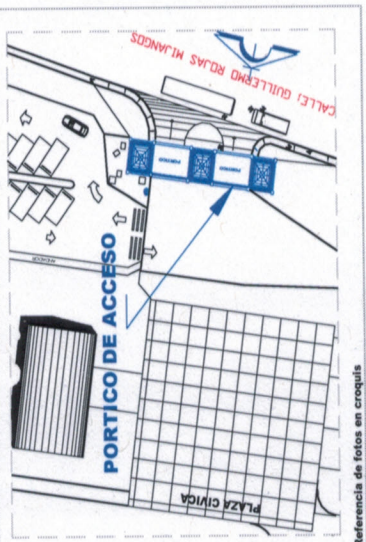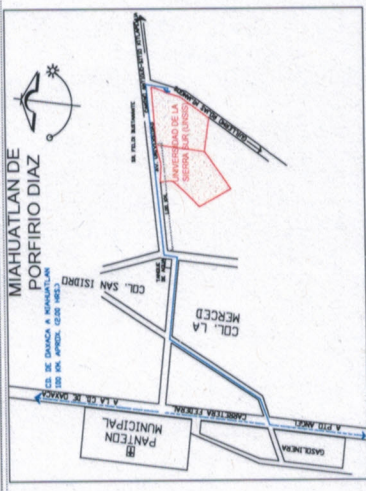

Referencia de fotos en croquis

FOTOS




F1: Fachada del portico de la UNSIS



F2: Vista interior del portico donde se instalarán los tornquetes de acceso



F3: Vista de perfil acceso vehicular de la UNSIS

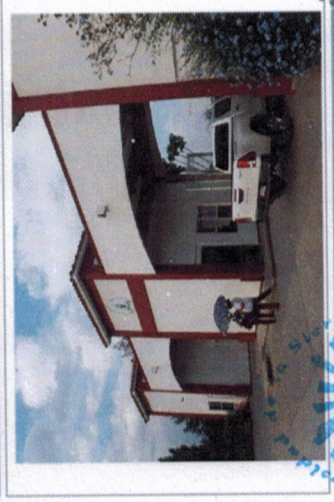

F4: Vista de perfil acceso peatonal de la UNSIS

Comentarios de los trabajos realizados:  
El proyecto "Sistema de acceso y seguridad a la UNSIS", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F1, muestra la Fachada del portico de la UNSIS

La fotografía F2, muestra la Vista interior del portico donde se instalarán los tornquetes de acceso

La fotografía F3, muestra la Vista de perfil acceso vehicular de la UNSIS

La fotografía F4, muestra la Vista de perfil acceso peatonal de la UNSIS


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, SN.  
ESQ. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO  
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Lic. Erick Alexis Ortiz Rodríguez  
Vicerector de Administración

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



\* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todos los obreros. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como obreros requiera. Para equipamiento, mantenimiento y educaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma tomas, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**Abril 2019**  
FECHA DE DEPORTE

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance



0

PROYECTO 4

Nombre de la obra

**Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

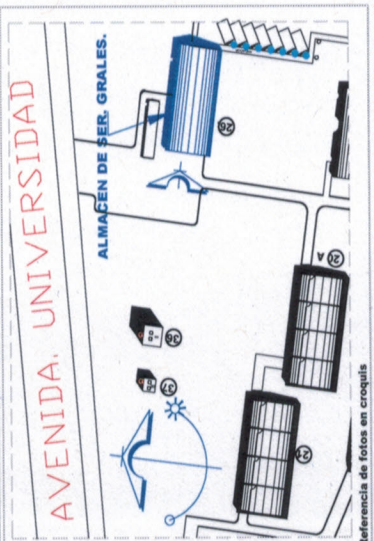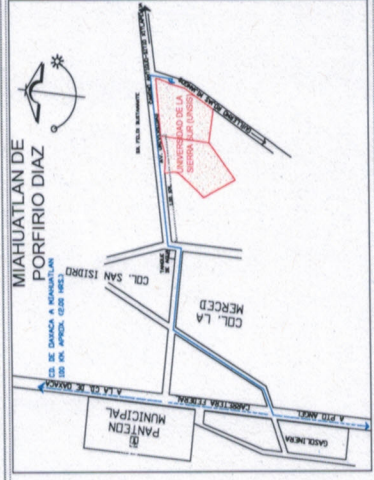

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MILANGOS, S/N.  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO  
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

**FOTOS**



F1: Vista frontal del almacén de servicios generales



F2: Bodega de madera improvisada para resguardar materiales



F3: acceso a almacén de servicios generales



F4: Vista posterior del almacén de servicios generales

Comentarios de los trabajos realizados:  
El proyecto "Ampliación del Almacén de Servicios Generales, en la Universidad de la Sierra Sur.", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

- La fotografía F1, muestra la Vista frontal del almacén de servicios generales
- La fotografía F2, muestra la Bodega de madera improvisada para resguardar materiales
- La fotografía F3, muestra el interior del aula C2, equipada con un proyector.
- La fotografía F4, muestra la Vista posterior del almacén de servicios generales

Lic. Erick Alexis Guzmán  
Vicecoordinador de Infraestructura de la UNISIS

Nombre y firma del titular de la obra

Lic. Erick Alexis Guzmán  
Jefe del Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento de la UNISIS

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la UNISIS

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar las planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mein reportado  
Abril\_2019  
FECHA DE CORTE



Porcentaje de avance

0


PROGRESOS

5

Nombre de la obra  
Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

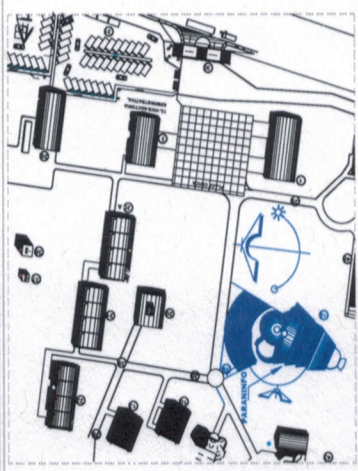


Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, SIN.  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO  
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.


FOTOS

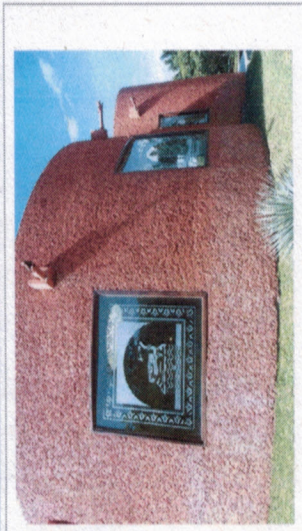


F1: Fachada del paramento

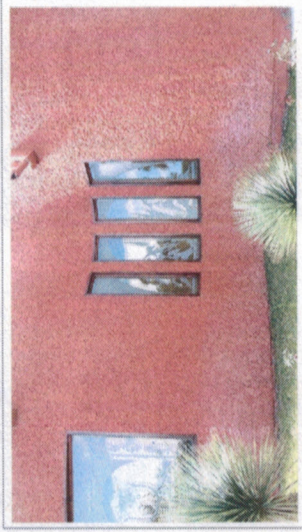


F2: Vista lateral del paramento

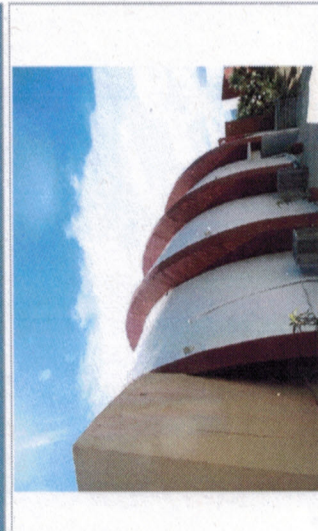

F3: Vista lateral del paramento

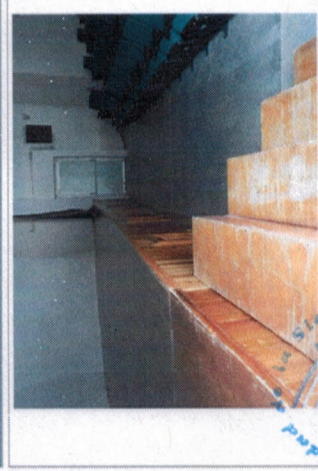

F4: Piso del escenario del paramento

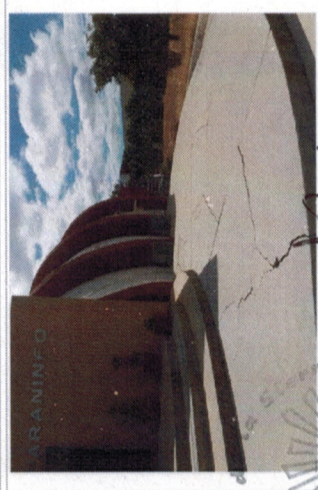

F5: Piso del acceso principal

Comentarios de los trabajos realizados:  
El proyecto "Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.

- La fotografía F1: Fachada del paramento
- La fotografía F2: Vista lateral del paramento
- La fotografía F3: Vista lateral del paramento
- La fotografía F4: Piso del escenario del paramento
- La fotografía F5: Piso del acceso principal
- La fotografía F6: Plafón y luminarias
- La fotografía F7: Loo de lobby
- La fotografía F8: Pintura e impermeabilizante
- La fotografía F9: Sanitarios para mujeres en el paramento

Lic. Edith Alvarado Valencia  
Vicecoordinadora de Planeación  
Nombre y firma del IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postalita, se podrán copiar para practicar geométrico. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para ser antes, durante y después de la obra.

UNISIS OAXACA

DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCION Y MTO.

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado  
**Abril 2019**  
FOLIO DE CORTE:



Porcentaje de avance



0

PROYECTO 5

Nombre de la obra:

Mantenimiento de Infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

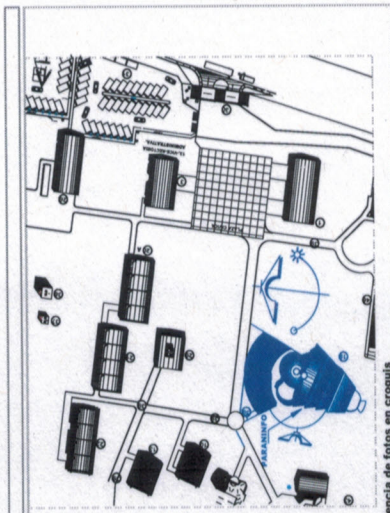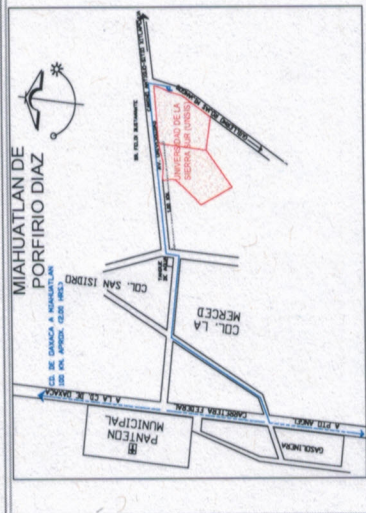

Referencia de fotos en croquis


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIANGOS, S/N,  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO  
DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.


FOTOS



F6: Fachada y numeración

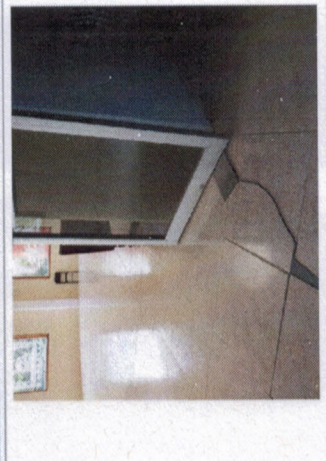

F7: Lobby del lobby

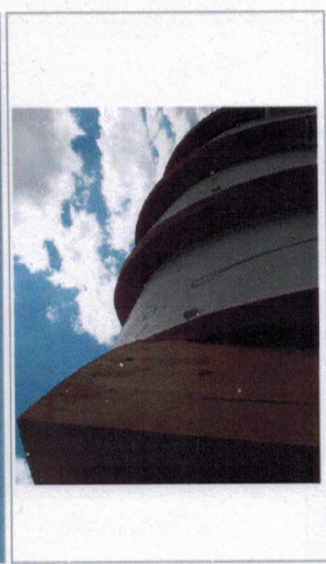

F8: Pintura e impermeabilizante



F9: Sanitarios para mujeres en el parámetro

Comentarios de los trabajos realizados:  
El proyecto "Mantenimiento de infraestructura académica en la Universidad de la Sierra Sur", se encuentra en proceso de Autorización ante las instancias estatales correspondientes.  
La fotografía F1: Fachada del parámetro  
La fotografía F2: Vista lateral del parámetro  
La fotografía F3: Vista lateral del parámetro  
La fotografía F4: Fachada del parámetro  
La fotografía F5: Piso del acceso principal del parámetro  
La fotografía F6: Plafón y luminarias  
La fotografía F7: Lobby del lobby  
La fotografía F8: Pintura e impermeabilizante  
La fotografía F9: Sanitarios para mujeres en el parámetro

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES  
*[Signature]*



\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Paralelo se anexa una pestilla, se podrán copiar estas pestillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR OAXACA**

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

**6** PRIORIDAD

Nombre de la obra: **Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía.**

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  
 CALLE GUILLERMO ROMAS MUJANGOS, SN,  
 ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD  
 UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Porcentaje de avance  
**0**

GRUPOS DE LOCALIZACIÓN

**FOTOS**

Referencia de fotos en croquis

**F1:** Aspecto de luminarias actuales

**F2:** Aspecto de luminarias actuales en andadores

**F3:** Aspecto de luminarias actuales en andadores

**F4:** Andador de plazuela a paramito

**F5:** Andador hacia aulas y salas de computo

Comentarios de los trabajos realizados:  
 El proyecto "Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía.", se encuentra en proceso de autorización ante las instancias estatales correspondientes.

La fotografía F1, muestra el Aspecto de luminarias actuales

La fotografía F2, muestra el Aspecto de luminarias actuales en andadores

La fotografía F3, muestra el andador a paramito

La fotografía F4, muestra el andador hacia aulas y salas de computo

**F6:** Andador a biblioteca

Nombre y firma del responsable de la IES  
 Lic. Estelita Ortiz  
 Vicedirectora de Planeación

**F7:** Aspecto de luminarias actuales en andadores

**F8:** Andador hacia aulas y salas de computo

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES  
 Lic. Salvador  
 Titular de Obras y Mantenimiento

**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR OAXACA**

**VICE-RECTORA**

**UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR OAXACA**

**DEPTO. DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y MTO.**

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar estas plantillas en caso de tener. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, misma posición y ángulo de toma, antes y después de la obra.

Página 1
