

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**


UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
Entidad federativa: Oaxaca  
Clave inst 911: 20NSU023N


Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia  
Cargo: Vice - Rector de Administración  
Teléfono: 01 951 57 2 41 00  
Correo electrónico: eov16@hotmail.com Y vadmim@uniss.edu.mx


Nombre: Arc. Raquel Lopez Salvador  
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306  
Correo electrónico: chivane177@hotmail.com Y rsalvador@uniss.edu.mx

RESPONSABLES  
Obras y Mantenimiento

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	cantidad	metros cuadrados			Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento de inauguración?	¿Cuenta con fotos del evento de inauguración?	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (Acta Irregular)	Monto de Acta Administrativa	
1	Construcción del Centro de Patología Clínica	X			\$ 15,709,603.00	\$ 2,791,387.66	\$ 12,918,215.34	11	1146.69		El 02 de julio de 2020, se iniciaron los trabajos, se están realizando muros de ladrillo, cadenas intermedias, castillos, armado y cimbrado de muros, losas, y trabes.	5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado). 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	28.9	02/07/20	27/01/21	El 02 de julio de 2020, se iniciaron los trabajos, se están realizando muros de ladrillo, cadenas intermedias, castillos, armado y cimbrado de muros, losas, y trabes.					
2	Planta Purificadora de Agua	X			\$ 397,740.00	\$ -	\$ 397,740.00	25	1890.00		Se cuenta con el Oficio de Autorización, actualizado, este proyecto está en revisión de expediente, por parte del Comité Estatal de adquisiciones, para posteriormente iniciar con el proceso de licitación.	2. Ejecutar el recurso de acuerdo a la Ley de licitación pública nacional, dependiendo de los montos a ejercer. 3. Emitir el fallo y formalizar la compra a través de la firma de un contrato con el proveedor adjudicado. 4. Recibir la planta purificadora de agua, colocada y hacer las pruebas necesarias para su buen funcionamiento. 5. Dar seguimiento de las adquisiciones y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes del Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado).	5	27/07/20	30/11/20	Se cuenta con el Oficio de Autorización, actualizado, este expediente, por parte del Comité Estatal de adquisiciones, para posteriormente iniciar con el proceso de licitación.					
4	Construcción de un Edificio de Cubículos para Profesores, de la DIES de Salud	X			\$ 6,516,133.00	\$ 1,330,056.63	\$ 5,186,077.37	1	0.00	35	451.41	El 02 de julio de 2020, se iniciaron los trabajos, se están realizando muros de ladrillo, cadenas intermedias, castillos, armado y cimbrado de muros, losas, y trabes de entrapiso, ramaleo de instalaciones.	5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado).	29.33	02/07/20	13/11/20	El 02 de julio de 2020, se iniciaron los trabajos, se están realizando muros de ladrillo, cadenas intermedias, castillos, armado y cimbrado de muros, losas, y trabes de entrapiso, ramaleo de instalaciones.				
<b>TOTAL</b>								45	723.48												

Nombre y firma del Titular de la IES  
  
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia  
Vice Rector de Administración

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES  
  
Arc. Raquel Lopez Salvador  
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
OAXACA  
DEPTO. DE PROYECTOS  
CONSTRUCCION Y MTO.

1 Se capturaron los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

<p>UNIVERSIDAD de la Sierra Sur <b>UNISIS</b> OAXACA</p> <p>Porcentaje de avance</p> <p><b>28.9</b></p>	<p><b>1</b> Nombre de la obra: <b>Construcción del Centro de Patología Clínica</b></p> <p><b>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</b></p>	<p><b>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</b></p> <p>Referencia de fotos en croquis</p>	<p><b>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</b></p> <p>CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, SIN. ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.</p>
---	--	---	--

**FOTOS**

F1- Cimbrado de traves

F2- Cimbrado y colado de muros

**Comentarios de los trabajos realizados:**

El proyecto: Construcción del Centro de Patología Clínica. Está en proceso de ejecución, para después Gestionar la autorización del proyecto ante la Subsecretaría de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

**La fotografía muestra:**

- F1- Cimbrado de traves
- F2- Cimbrado y colado de muros
- F3- acero en elementos estructurales
- F4- Muros de ladrillo rojo
- F5:

F3- acero en elementos estructurales

F4- Muros de ladrillo rojo

**Comentarios de los trabajos realizados:**

El proyecto: Construcción del Centro de Patología Clínica. Está en proceso de ejecución, para después Gestionar la autorización del proyecto ante la Subsecretaría de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

**La fotografía muestra:**

- F1- Cimbrado de traves
- F2- Cimbrado y colado de muros
- F3- acero en elementos estructurales
- F4- Muros de ladrillo rojo
- F5:

Lic. Erick Alexis Ortiz Hernández  
Vicerrector de Planeación  
Nombre y firma del Titular de IES

Arq. Rafael López Salazar  
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

UNIVERSIDAD de la Sierra Sur  
**UNISIS**  
OAXACA  
VICE-RECTORIA  
DE ADMINISTRACIÓN

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas páginas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar por el menos, durante y después de la obra.

Página 1

CONSTRUCCION Y MTO.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

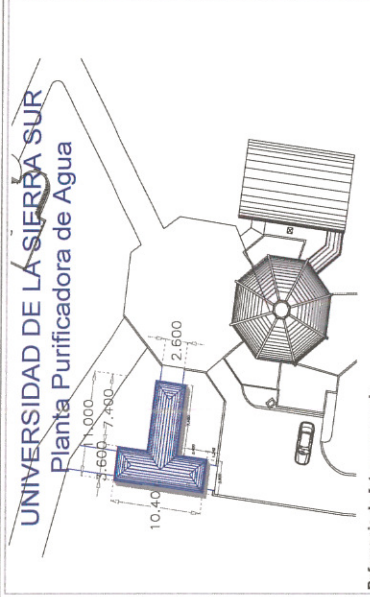
PRIMORDIA

2

Nombre de la obra:

Planta Purificadora de Agua

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Porcentaje de avance

5

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,  
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.  
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO  
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1- Área para La Planta Purificadora



F2- Despalme de terreno



F3- Excavación en cepas



F4- Aline de talud en cepas

Comentarios de los trabajos realizados:

El proveedor: Planta Purificadora de Agua...  
El proyecto: Planta Purificadora de Agua...  
El contrato: Contrato de prestación de servicios...  
La autorización del proyecto: Resolución de la Subsecretaría de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

- La fotografía muestra: F1- Área para La Planta Purificadora
- La fotografía muestra: F2- Despalme de terreno
- La fotografía muestra: F3- Excavación en cepas
- La fotografía muestra: F4- Aline de talud en cepas
- La fotografía muestra: F5:

Lic. Erick Alexis Cobarrubias  
Vicerrector de Administración  
Nombre y firma del Titular de la Obra

Ato. Raquel López Salgado  
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar...  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

<p>PRORIDAD <b>4</b></p> <p>Nombre de la obra: <b>Construcción de un Edificio de Cubículos para Profesores, de la DES de Salud</b></p> <p>Porcentaje de avance <b>29.33</b></p>	<p>MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ</p>	<p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p> <p>Construcción de un Edificio de Cubículos para Profesores, de la DES de Salud</p> <p>Referencia de fotos en croquis</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> <p>CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, SIN, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P. 70800.</p>
---	------------------------------------	--	---

		<p>Comentarios de los trabajos realizados:</p> <p>El proyecto: Construcción de un Edificio de Cubículos para Profesores, de la DES de Salud. Esta en proceso de actualización de precios, para después Gestionar la autorización del proyecto, ante la Subsecretaría de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.</p> <p>La fotografía muestra: F1- Cimbrado de Trabes</p> <p>La fotografía muestra: F2- Muros, castillos, cadenas, planta baja</p> <p>La fotografía muestra: F3- Cimbrado, armado y ramaleo en losa de entrepiso</p> <p>La fotografía muestra: F4- Relleno y compactación con material de banco</p> <p>La fotografía muestra: F5:</p>
		<p>F1- Cimbrado de Trabes</p> <p>F2- Muros, castillos, cadenas, planta baja</p> <p>F3- Cimbrado, armado y ramaleo en losa de entrepiso</p> <p>F4- Relleno y compactación con material de banco</p> <p>F5:</p>

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR OAXACA

VICERECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Erick Alexis Obeso  
Vicerector de Administración

Ara. Raquel López Salvador  
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

DEPTO. DE PROYECTOS

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar, para el antes, durante y después de la obra.

Se podrán copiar tantas páginas como sea necesario.
