

2021


FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Marzo_2022
FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Universidad de la Sierra Sur

Universidad federativa: Oaxaca

ave Inst 911: 20MSU0023N

Nombre: L C E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice- Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y admin@unsi.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsi.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1			Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar	% de avance	Fechas 3		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada ¿Cuenta con fotos del evento?	Cuenta con Actas				
		Obra de construcción	Equipamiento	Adecuación	Mantenimiento				Proyecto sus	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio				Término	Entrega Recepción (Acta friquillo)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Monto de Acta Administrativa	
1	Construcción del Centro de Desarrollo Gubernamental y Empresarial	X				\$7,125,000.00	\$ 7,125,000.00	\$ -	lab. de desarrollo organizacional	1	159.89	Proyecto concluido	6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	GLOBAL DEL PROYECTO	100	17/08/21	15/03/22	Proyecto concluido	Esta obra es susceptible de ser inaugurada, ya que concentra varias áreas para la práctica e investigación de las carreras de Administración municipal, Administración Pública, Ciencias Empresariales, e Informática, y en general para la DES de Ciencias sociales y Administrativas, como son las áreas de lab. de desarrollo organizacional, lab. de formulación y evaluación de proyectos, lab. de sistemas de información geográfica, salón de cabildo, y lab. de medios audiovisuales.			si	si	\$7,125,000.00
2	Equipamiento del Centro de Patología Clínica	X				\$3,159,070.00	\$ 3,159,070.00	\$ -	mesa con cubierta de acero inoxidable de 2.34 m de largo x 0.64 m de ancho x 0.90 m de alto	8		Proyecto concluido	5. Dar seguimiento de las adquisiciones y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, SHCP, SCTG, SF)	GLOBAL DEL PROYECTO	100	22/11/21	03/02/22	Proyecto concluido	Este proyecto es susceptible de ser inaugurado, ya que el equipo adquirido se encuentra en las áreas correspondientes, del Centro de Patología Clínica, permitiendo realizar las practicas e investigación de la carrera de medicina y en general para la DES de salud.			si	si	\$ 3,159,070.00
4	Construcción de Cafetería	X				\$7,907,050.00	\$ 7,907,050.00	\$ -	Comedor	2	958.94	Proyecto concluido	6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	GLOBAL DEL PROYECTO	100	01/09/21	28/03/22	Proyecto concluido	Este proyecto se realizara en 2 etapas, la primera etapa se ha concluido y abarca hasta obra gris, la segunda etapa contempla los acabados del edificio, los cuales se realizaran con recursos del FAM 2022.			si	si	\$7,907,050.00
8	Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada	X				\$3,584,011.99	\$ 3,584,011.99	\$ -	cancha de básquetbol	1	671.74	Proyecto concluido	6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	GLOBAL DEL PROYECTO	100	01/09/21	22/02/22	Proyecto concluido	Este proyecto se realizara en 2 etapas, la primera etapa se ha concluido, la segunda etapa contempla la cubierta médica, este proyecto se realizara con recursos del FAM 2022.			si	si	\$3,584,011.99
									TOTAL	14	836.87													
									TOTAL	92	6.00													
									TOTAL	11	1359.89													
									TOTAL	9	1008.27													

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice-rector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTO.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo 2022

FECHA DE CORTE

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Universidad de la Sierra Sur

Universidad federativa: Oaxaca

Ave Inst 911: 20MSU0023N

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia

Cargo: Vice - Rector de Administración

Teléfono: 01 951 57 2 41 00

Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

RESPONSABLES

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas			
		Obra de construcción	Equipamiento	Adecuaciones	Mantenimiento				Proyecto sus	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Físico)
P-N	Equipamiento de la cafetería	X				\$1,937,400.00	\$1,937,400.00	\$	estufa de acero inoxidable de 6 quemadores con horno	1		Proyecto concluido	5. Dar seguimiento de las adquisiciones y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, SHCP, SCTG, SF)	100	22/11/2021	18/02/2022	Proyecto concluido	Contamos con el equipamiento adquirido con este proyecto, el cual se instalara en el edificio de Cafetería, una vez que se concluya la segunda etapa (acabados), para lo cual se cuenta con recursos del FAM 2022.	si	si	\$ 1,937,400.00	
									estufa de acero inoxidable de 4 quemadores con gabinete abierto	1												
									plancha de acero inoxidable con gabinete abierto	1												
									estufón de acero inoxidable con 3 quemadores	1												
									freidora de acero inoxidable	1												
									refrigerador de acero inoxidable de 2 puertas	1												
									refrigerador o enfriador con 2 puertas de vidrio templado	1												
									congelador o conservador horizontal	1												
									vitrina refrigerada de acero inoxidable	1												
									campana de extracción de acero inoxidable de 3.1 m	2												
									baño maría a gas de acero inoxidable de 2.4 m con insertos	2												
									barra fría de acero inoxidable de 1.5 m con insertos	2												
									mesa de acero inoxidable de 2.5 m con lambrín, 2 tarjas y entrepaño	2												
									mesa de acero inoxidable de 2 m con lambrín, 2 tarjas y entrepaño	1												
									mesa de acero inoxidable de 1.4 m con lambrín tarja izquierda y entrepaño	1												
									mesa isla de acero inoxidable de 1.4 m con tarja izquierda y entrepaño	2												
									mesa de acero inoxidable de 1.1 m con lambrín, tarja y entrepaño	1												
									mesa de trabajo en isla de acero inoxidable de 1.5 m con repisa y entrepaño	2												
									mesa de acero inoxidable de 2.4 m con lambrín y entrepaño	1												
									mesa de acero inoxidable de 2 m con lambrín y entrepaño	1												
									mesa de acero inoxidable de 1.2 m con lambrín y entrepaño	1												
									mesa de acero inoxidable de 0.5 m con lambrín y entrepaño	3												
									gabinete abierto de acero inoxidable de 2 m con lambrín, respaldo y entrepaño	1												
									gabinete abierto de acero inoxidable de 1.8 m con lambrín, respaldo y entrepaño	3												
									gabinete abierto de acero inoxidable de 1 m con lambrín, respaldo y entrepaño	1												
									alacena de acero inoxidable de 2 m de 4 puertas con entrepaño	1												
									gabinete con lavamanos de acero inoxidable, con accionador tipo pedal	1												
									anaquel tipo marimba de acero inoxidable de 4 entrepaños de 1.2 m	3												
									anaquel tipo marimba de acero inoxidable de 4 entrepaños de 0.9 m	3												
									garabato a pared de acero inoxidable de 1 m	2												
									silla	187												
									mesa de 90cm x 90cm	47												
									montapiatos	1												
									TOTAL	488												
										4736.32												

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tantas filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo_2022


FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: **Construcción del Centro de Desarrollo Gubernamental y Empresarial**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

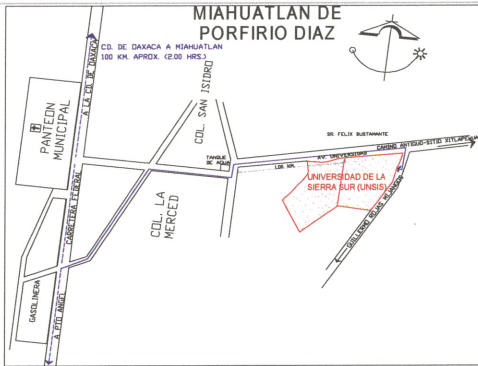

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.



Porcentaje de avance

100

FOTOS



F1- Ludoteca - loseta, canceleria, luminarias, plafon, pintura



F2- Sanitarios - azulejo, muebles de baño, mamparas



F3- Escaleras - barandal, loseta, pintura



F4- Vestibulo p. Baja - luminarias,puertas, plafon, loseta, pintura

Comentarios de los trabajos realizados:

El oprobeto: Construcción del Centro de Desarrollo Gubernamental v Empresarial
Este proyecto esta concluido

- La fotografía muestra: F1- Ludoteca - loseta, canceleria, luminarias, plafon, pintura
- La fotografía muestra: F2- Sanitarios - azulejo, muebles de baño, mamparas
- La fotografía muestra: F3- Escaleras - barandal, loseta, pintura
- La fotografía muestra: F4- Vestibulo p. Baja - luminarias,puertas, plafon, loseta, pintura

Lic. Erick Alexis Ordoñez Valencia
Viceirector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

Arg. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo_2022

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIA 2



Nombre de la obra: Equipamiento del Centro de Patología Clínica



Porcentaje de avance

100

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

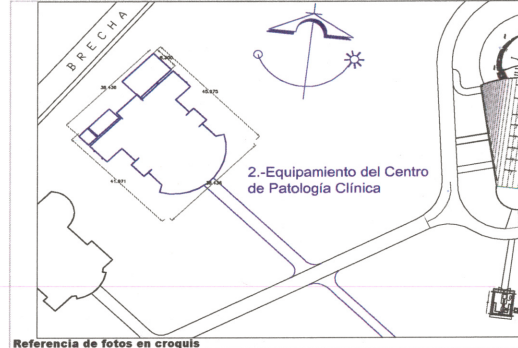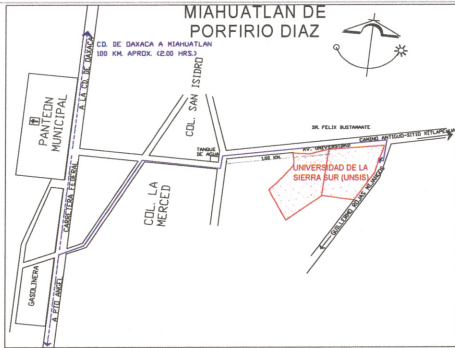

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Sillas para tomas de muestra



F2- Mesas con cubierta de acero inoxidable con tarja

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Equipamiento del Centro de Patología Clínica
Este proyecto se encuentra concluido

La fotografía muestra: F1- Sillas para tomas de muestra

La fotografía muestra: F2- Mesas con cubierta de acero inoxidable con tarja

La fotografía muestra: F3- Mesas pasteur

La fotografía muestra: F4- Mesas con cubierta de acero inoxidable

La fotografía muestra: F5:



F3- Mesas pasteur



F4- Mesas con cubierta de acero inoxidable

F5:

Lic. Erick Alexis Gómez Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo 2022

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

4

Nombre de la obra:



Construcción de Cafetería



Porcentaje de avance

100

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

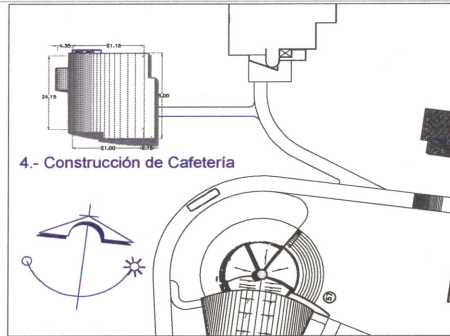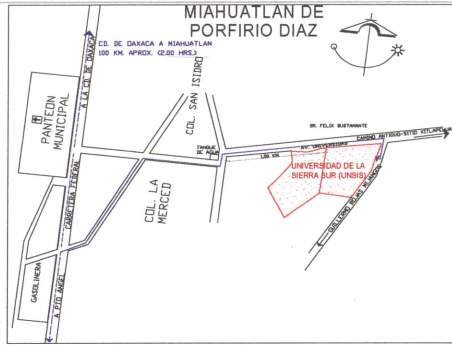

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Aplanado fino en exterior - Cafetería



F2- Fiermes de concreto - Cafetería



F3- Aplanado fino en interior - Cafetería



F4- Cubierta de Estructura metalica - Cafetería

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de Cafetería
Este proyecto esta concluido

La fotografía muestra: F1- Aplanado fino en exterior - Cafetería

La fotografía muestra: F2- Fiermes de concreto - Cafetería


La fotografía muestra: F3- Aplanado fino en interior - Cafetería

La fotografía muestra: F4- Cubierta de Estructura metalica - Cafetería

Lic. Erick Alexis Quirós Valencia
Vice rector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

Ara. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrá copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo_2022

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRORIDAD

8

Nombre de la obra:

Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

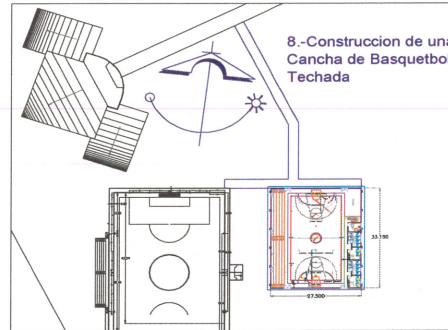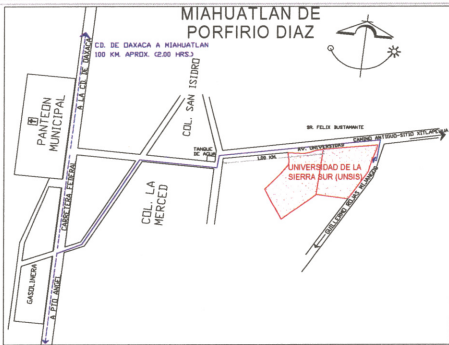

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.



Porcentaje de avance

100

FOTOS



F1- Interior Vestidores - Cancha



F2- Exterior Gradas - Cancha



F3- Exterior Vestidores y Baños - Cancha



F4- Interiore Sanitarios - Cancha

Comentarios de los trabajos realizados:

El provento: Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada
Este proyecto esta concluido

La fotografia muestra: F1- Interior Vestidores - Cancha

La fotografia muestra: F2- Exterior Gradas - Cancha

La fotografia muestra: F3- Exterior Vestidores y Baños - Cancha

La fotografia muestra: F4- Interiore Sanitarios - Cancha

La fotografia muestra: F5-

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

Ara. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obrás y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla se podrán captar tantas pestafas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Marzo_2022


FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD P-N Nombre de la obra: Equipamiento de la cafetería



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

100

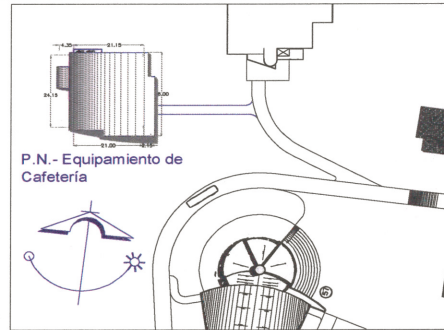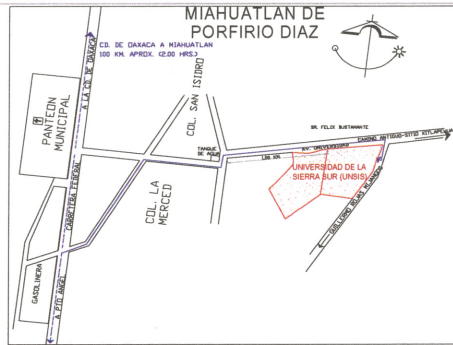

Referencia de fotos en croquis

CALLE GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Equipo de cocción



F2- mobiliario



F3- Equipo de refrigeración



F4- Muebles de acero inoxidable

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Equipamiento de la cafetería
Este proyecto se encuentra concluido

La fotografía muestra: F1- Equipo de cocción

La fotografía muestra: F2- mobiliario

La fotografía muestra: F3- Equipo de refrigeración

La fotografía muestra: F4- Muebles de acero inoxidable

La fotografía muestra: F5:

Lic. Erick Alexis Gómez Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

Ara. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

