

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio_2022

FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



No: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca

Clave Inst 911: 20MSU0023N

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eao16@hotmail.com y vadmin@unsi.edu.mx

RESPONSABLES

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00 ext. 1306
Correo electrónico: chavara77@hotmail.com y rsalvador@unsi.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			
		Obra de civil	Equipamiento	Adquisiciones	Mantenimiento	Proyecto sus				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			Entrega- Recepción (Acta final)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Monto de Acta Administrativa	
																							¿Cuenta con fotos del evento?
5	Equipamiento para Laboratorios de la DES de salud	X					\$3,007,750.00	\$	\$ 3,007,750.00	lector de radiografía dental	1		Este proyecto está en proceso de dictaminación y autorización, bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.	2. Ejercer el recurso de acuerdo a la Ley de obras públicas vigente, siendo adjudicación, invitación o licitación pública nacional, dependiendo de los montos a ejercer. 3. Emitir el fallo y formalizar el contrato de obra pública con la empresa a la que fue adjudicado el proyecto. 4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la supervisión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado).	0	15/07/22	20/12/22	Este proyecto está en proceso de dictaminación y autorización, bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Servicios del Estado de Oaxaca.					
TOTAL										53	0.00												
7	Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad	X					\$6,056,067.00	\$0.00	\$ 6,056,067.00	estacionamiento de bicicletas, motocicletas, automoviles, caseta de vigilancia	1	3696.87	Este proyecto está en proceso de autorización ante Instancias Estatales	1. Gestionar ante la Subsecretaría de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado la autorización del recurso para la ejecución del proyecto. 2. Ejercer el recurso de acuerdo a la Ley de obras públicas vigente, siendo adjudicación, invitación o licitación pública nacional, dependiendo de los montos a ejercer. 3. Emitir el fallo y formalizar el contrato de obra pública con la empresa a la que fue adjudicado el proyecto. 4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la supervisión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado). 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	0	15/08/2022	31/12/2022	Este proyecto está en proceso de Autorización ante Instancias Estatales					
TOTAL										1	3696.87												

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice Rector de Administración

Nombre y firma del Titular de la IES



DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0

PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: **Construcción de Cafetería (Terminación)**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

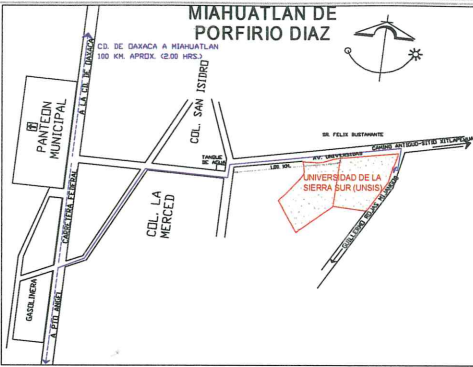

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.


FOTOS



F1- vista de perfil del edificio de Cafetería



F2- Interior comedor de Cafetería

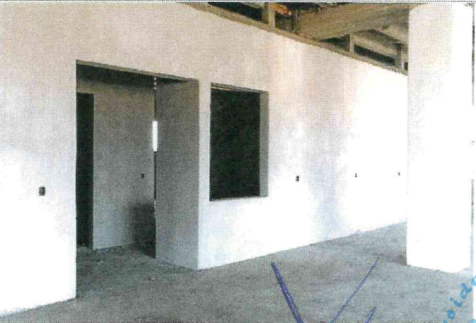

F3- Interior area de Cocina, en cafetería



F4- Fachada Principal, Cafetería

Comentarios de los trabajos realizados:


El proyecto: Construcción de Cafetería (Terminación)
Este proyecto está en revisión de bases de licitación ante la Secretaría de la
Contraloría Estatal

- La fotografía muestra: F1- vista de perfil del edificio de Cafetería
- La fotografía muestra: F2- Interior comedor de Cafetería
- La fotografía muestra: F3- Interior area de Cocina, en cafetería
- La fotografía muestra: F4- Fachada Principal, Cafetería

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Raquel López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.




REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 2 Nombre de la obra: **Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada (Terminación)**




Porcentaje de avance

0

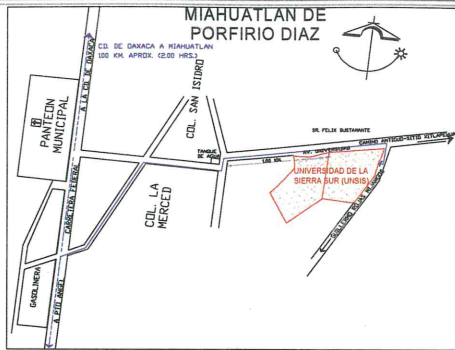

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

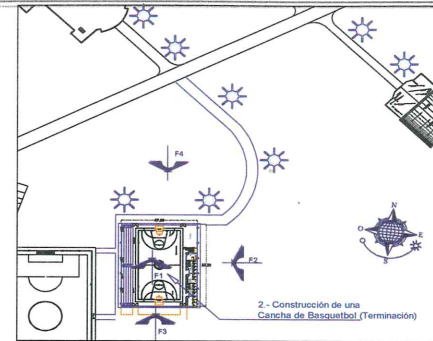

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Vista sur - cancha



F2- Vista posterior cancha



F3- Vista sur - cancha



F4- Vista norte - cancha

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de una Cancha de Basquetbol Techada (Terminación)
Este proyecto está en revisión de bases de licitación ante la Secretaría de la
Contraloría Estatal

- La fotografía muestra: F1- Vista sur - cancha
- La fotografía muestra: F2- Vista posterior cancha
- La fotografía muestra: F3- Vista sur - cancha
- La fotografía muestra: F4- Vista norte - cancha
- La fotografía muestra: F5:

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Raquel López Salvador
Jefe del Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
UNISIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MITO.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRIMORDIA 3

Nombre de la obra: **Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

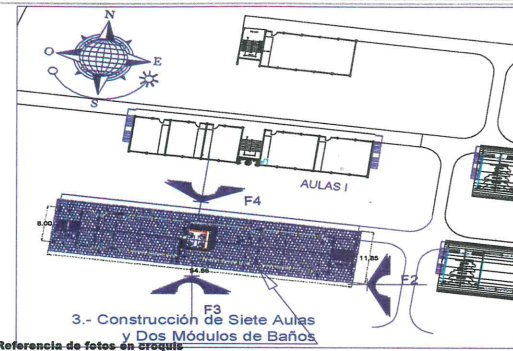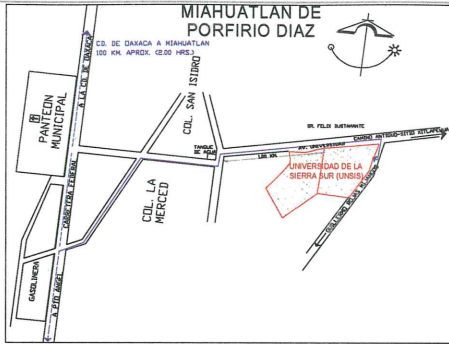

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD,
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS



F1- Vista aérea del edificio



F2- Vista Este - Oeste



F3- Vista Sur - Norte



F4- Vista Norte - Sur

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños
Este proyecto está en proceso de licitación, el fallo se celebrara el día 15 de julio de 2022

- La fotografía muestra: F1- Vista aérea del edificio
- La fotografía muestra: F2- Vista Este - Oeste
- La fotografía muestra: F3- Vista Sur - Norte
- La fotografía muestra: F4- Vista Norte - Sur

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Raquel López Salvador

Jefa del Depto. De Proyectos/ Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

OAXACA
VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de La Sierra Sur
UNISIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0

Nombre de la obra: Equipamiento para Laboratorios de la DES de salud

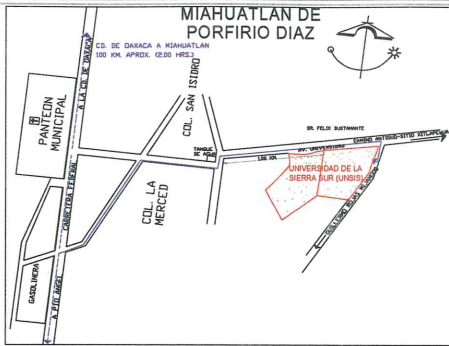

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

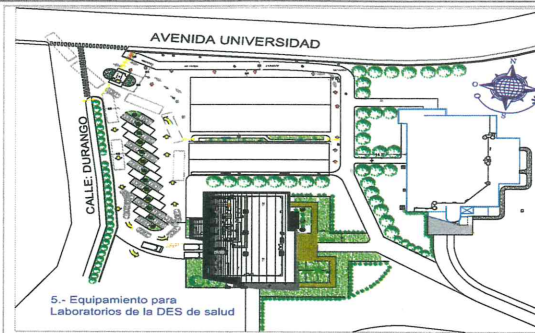

Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.


FOTOS



F1- ODONTOLOGIA - TALLER DENTAL 2

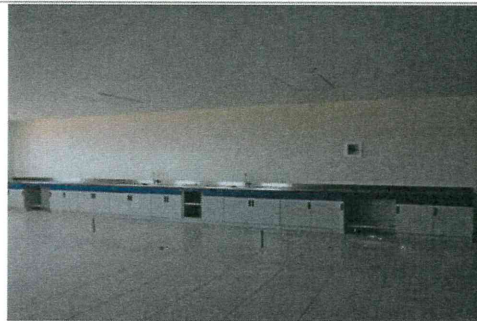

F2- ODONTOLOGIA - TALLER DENTAL 2

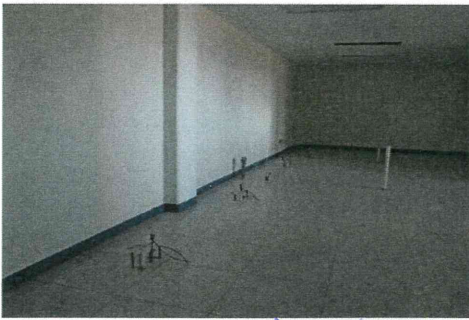

F3- ODONTOLOGIA - CLINICA DENTAL 2



F4- ODONTOLOGIA - CLINICA DENTAL 2

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Equipamiento para Laboratorios de la DES de salud. Este proyecto esta en proceso de dictaminación y autorización, bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.

- La fotografía muestra: F1- ODONTOLOGIA - TALLER DENTAL 2
La fotografía muestra: F2- ODONTOLOGIA - TALLER DENTAL 2
La fotografía muestra: F3- ODONTOLOGIA - CLINICA DENTAL 2
La fotografía muestra: F4- ODONTOLOGIA - CLINICA DENTAL 2
La fotografía muestra: F5: ODONTOLOGIA - CLINICA DENTAL 2




F5- ODONTOLOGIA - CLINICA DENTAL 2

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Reyes López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD 7


Nombre de la obra: **Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad**



Porcentaje de avance

0

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

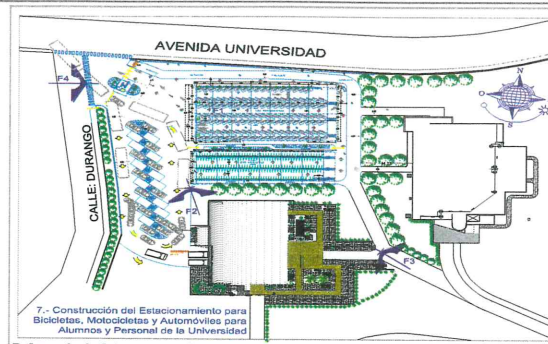

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

FOTOS




F1- Vista aérea del edificio



F2- Vista Sur - Norte



F3- Vista Oeste - Este

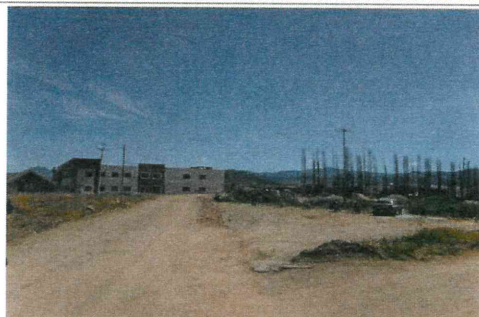

F4- Vista Este - Oeste

Comentarios de los trabajos realizados:

Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad

Este proyecto está en proceso Autorización ante Instancias Estatales

La fotografía muestra: F1- Vista aérea del edificio

La fotografía muestra: F2- Vista Sur - Norte

La fotografía muestra: F3- Vista Oeste - Este

La fotografía muestra: F4- Vista Este - Oeste

La fotografía muestra: F5:

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Viceirector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

Ara. Rafael López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
