

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Segundo Trimestre 2023

Fecha de elaboración 10/07/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave SI: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavane177@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO


OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFAM, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, Monto autorizado (A), Monto ejercido (D), Remanente (E)=B-D, Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado), Acciones que sustentan el avance, Fechas Reales, Reintegro a la TESOFE, Actas.

Signature of Arq. Raquel López Salvador, Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento, Universidad de la Sierra Sur.



Signature of Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia, Vicerector de Administración, Universidad de la Sierra Sur.



Signature of Mtra. María de los Angeles Peralta Arias, Rectora, Universidad de la Sierra Sur.



1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pediran anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta seccion se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotografico.
3 Es importante que las fechas de inicio y termino esten actualizadas. Todas en dos digitos. dd, mm y aa.

DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTTO.

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACION

RECTORIA

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: Segundo Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 10/07/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave SI: 20MSU0023N
Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

RESPONSABLES

Planificación
Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFAM, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución de la obra, Monto autorizado, Monto ejercido, Remanente, Especies físicos/equipamiento, Acciones que sustentan el avance, % de avance, Fechas Reales, Observaciones, Reintegro a la TESOFE, Actas.

Signature of Arq. Raquel López Salvador, Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento, Universidad de la Sierra Sur



Signature of Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia, Vice Rector de Administración, Universidad de la Sierra Sur



Signature of Mtra. María de los Angeles Peralta Arias, Rectora, Universidad de la Sierra Sur



1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anhear tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTTO.

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: Segundo Trimestre 2023

Fecha de elaboración 10/07/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavana17@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFAM, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución de la obra, Monto autorizado (A), Monto ejercido (D), Remanente (E) = B-D, Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado), Acciones que sustentan el avance, Fechas Reales, Reintegro a la TESOFE, Actas.

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur



Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur



Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotografico.
3 Es importante que las fechas de inicio y termino estén actualizadas. Todas en dos digitos dd, mm y aa.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Trimestre y año que se reporta: Segundo Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 10/07/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave 911: 20MSU0023N

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO


OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, Espacios físicos/equipamiento, Acciones que sustentan el avance, Fechas Reales, Reintegro a la TESOFE, Actas. Includes rows for 'Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur', 'Construcción de dos Salas de Computo', and 'Mantenimiento de la Biblioteca Universitaria'.

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur



Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice Rector de Administración
Universidad de la Sierra Sur



Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y termino estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACION

RECTORIA

2023

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Trimestre y año que se reporta:
Segundo Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 10/07/2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance

0.00%


INDICADOR 2

Nombre de la obra: Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

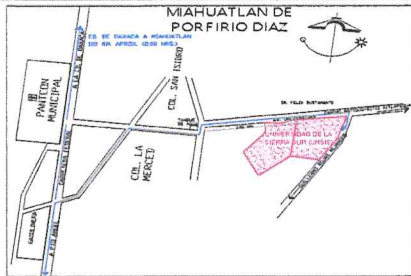

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

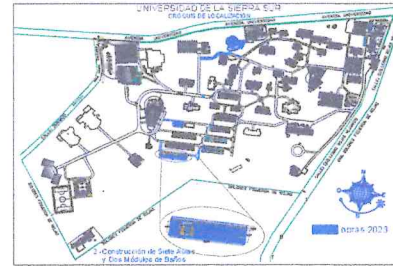

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N. ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800

FOTOS



F1- Vista aerea del edificio



F2- Vista Este - Oeste



F3- Vista Sur - Norte



F4- Vista Oeste - Este

Observaciones :

El proyecto: Construcción de Siete Aulas y Dos Módulos de Baños referente a este proyecto, se cuenta con el oficio de autorización emitido por instancias estatales, y se encuentra en tramite la revision de bases para el proceso de licitacion

- La fotografia muestra: F1- Vista aerea del edificio
- La fotografia muestra: F2- Vista Este - Oeste
- La fotografia muestra: F3- Vista Sur - Norte
- La fotografia muestra: F4- Vista Oeste - Este

OBRAS
Lic. Russell Lopez Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur



PLANEACIÓN
Lic. Erik Alexis Ochoa Jiménez
Vicepresidente de Administración
Universidad de la Sierra Sur



RECTOR
Mtra. María de los Angeles Paralta Ariza
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Segundo Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 10/07/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


0.00%

PROYECTO


3

Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

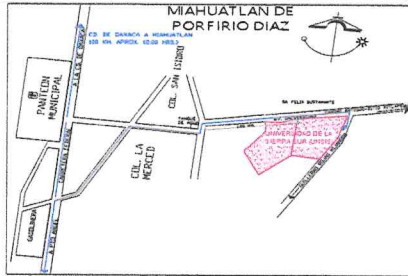

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

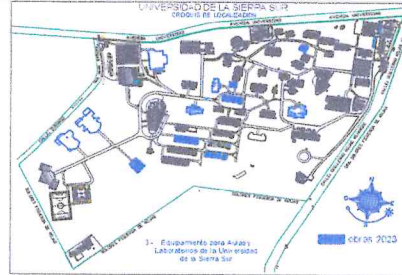

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N. ESC. AV.
UNIVERSIDAD COLONIA CD. UNIVERSITARIA,
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800

FOTOS



F1-AULAS



F2-AULAS

Observaciones :

El proyecto: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur
Este proyecto esta en proceso de autorizante ante instancias estatales.

La fotografia muestra: F1- AULAS

La fotografia muestra: F2- AULAS

La fotografia muestra: F3- AULAS

La fotografia muestra: F4- LABORATORIO DE COMPUTO

La fotografia muestra: F5: CINA - ANTROPOMETRIA



F3-AULAS



F4- LABORATORIO DE COMPUTO



F5: CINA - ANTROPOMETRIA

OBRAS

Rafael López Salazar
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur



PLANEACIÓN

Lic. Erick Alexis Ochoa Velasco
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur



RECTOR

Mtra. María de los Angeles Parrita Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



NOTA:

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA

2023

FAM

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGA EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
Segundo Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 10/07/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance


0.00%

PROYECTO: 3 Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

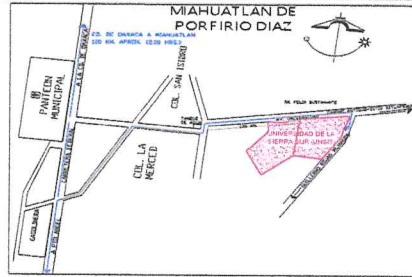

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

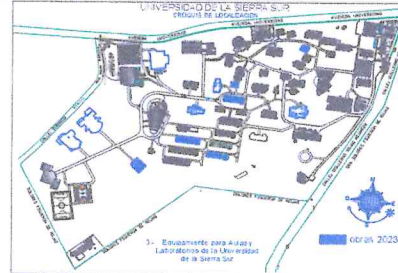

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, SN. ESQ. AV.
UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA,
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P.:70800

FOTOS



F6- CLINICA ROBOTIZADA - SALA DE EXPULSION



F7- CLINICA ROBOTIZADA - UCIN



F8- CLINICA ROBOTIZADA - LABOR DE PARTO



F9- CLINICA ROBOTIZADA - UCI



F10: ODONTOLOGIA - CLINICA 1

Observaciones :

El proyecto: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur
Este proyecto esta en proceso de autorizacion ante instancias estatales.

La fotografia muestra: F6- CLINICA ROBOTIZADA - SALA DE EXPULSION

La fotografia muestra: F7- CLINICA ROBOTIZADA - UCIN

La fotografia muestra: F8- CLINICA ROBOTIZADA - LABOR DE PARTO

La fotografia muestra: F9- CLINICA ROBOTIZADA - UCI

La fotografia muestra: F10: ODONTOLOGIA - CLINICA 1

OBRAS
Pro. Riquel López Salvador
Jefe del Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN
Lto. Erick Alexis Oshea Valencia
Vice rector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR
Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pastas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTTD.

UNSI
OAXACA
VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

UNSI
OAXACA
RECTORÍA

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Segundo Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 10/07/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance


0.00%

PROYECTO: 3 Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

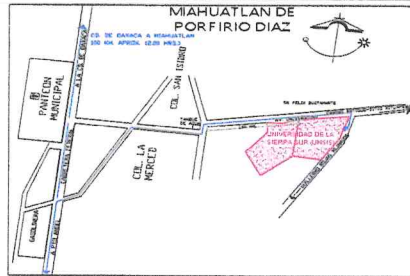

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

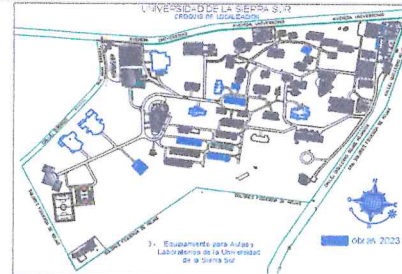


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal:
GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, SN. ESQ. AV.
UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA,
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P:70800

FOTOS

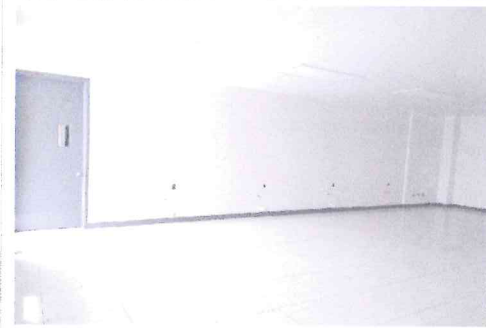

F11- PATOLOGIA CLINICA- MICROBIOLOGIA



F12- ODONTOLOGIA - IMAGENOLOGIA

Observaciones :

El proyecto: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Sierra Sur
Este proyecto esta en proceso de autorizacion ante instancias estatales.

La fotografia muestra: F11- PATOLOGIA CLINICA- MICROBIOLOGIA

La fotografia muestra: F12- ODONTOLOGIA - IMAGENOLOGIA

La fotoorafía muestra: F13- ANATOMIA-ANFITEATRO

La fotoorafía muestra: F14- ANATOMIA-SALA DE MODELOS

La fotoorafía muestra: F15:



F13- ANATOMIA-ANFITEATRO



F14- ANATOMIA-SALA DE MODELOS

F15:

OBRAS
Arq. Ricardo López Salazar
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur



PLANEACION
Lic. Erick Aleksi Ortega Valencia
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur



RECTOR
Mtra. María de los Angeles Peñate Arlas
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTO.

VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACION

RECTORIA

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
Segundo Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 10/07/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance

0.00%


PRIORIDAD 5

Nombre de la obra: Construcción de dos Salas de Computo

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

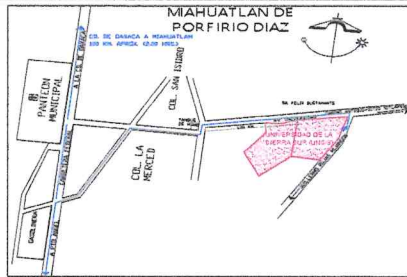

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

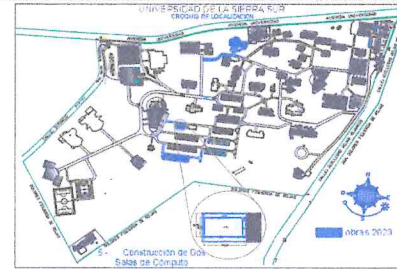

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESC. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P.70800

FOTOS



F1- Vista aerea del edificio



F3- Vista Sur - Norte



F4- Norte - Sur



F2- Vista Este - Oeste

Observaciones :

El proyecto: Construcción de dos Salas de Computo referente a este proyecto, se cuenta con el oficio de autorizacion emitido por instancias estatales, y se encuentra en tramite la revision de bases para el proceso de licitacion

La fotografia muestra: F1- Vista aerea del edificio

La fotografia muestra: F3- Vista Sur - Norte

La fotografia muestra: F4- Norte - Sur

La fotografia muestra: F2- Vista Este - Oeste

OBRAS
[Signature]
Ing. Riquelme López Salgado
Jefe del Depto. de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN
[Signature]
Lic. Erick Alexis Correa Valenzuela
Vicecoordinador de Administración
Universidad de la Sierra Sur

UNSI
VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

RECTOR
[Signature]
Mtra. María de los Angeles Parrita Ariza
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTTO.

RECTORÍA

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


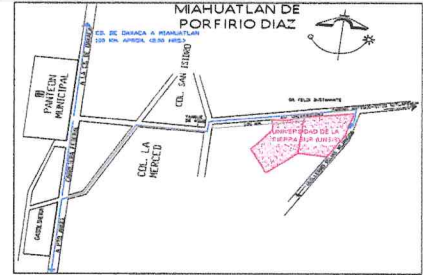
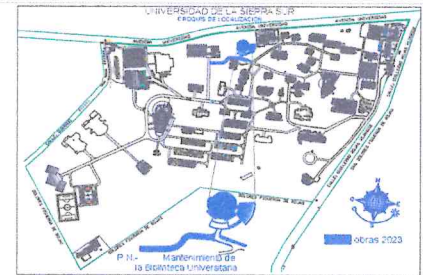

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Segundo Trimestre 2023

Fecha de elaboración: 10/07/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Porcentaje de avance</p> <p>0.00%</p>	<p>PRIMORDIAL P.N Nombre de la obra: Mantenimiento de la Biblioteca Universitaria</p>	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N. ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, C.P.70800</p>
---	--	---	--	---

FOTOS				
 <p>F1- Vista aerea del edificio</p>	 <p>F2- Loseta y azulejo en baños</p>	<p>Observaciones :</p> <p>El proyecto: Mantenimiento de la Biblioteca Universitaria Este proyecto esta en proceso de autorizacion ante instancias estatales.</p>		
 <p>F3- loseta en planta alta</p>	 <p>F4- loseta en planta baja</p>	 <p>F5: Mamparas en baños</p>		

OBRAS

[Signature]

Mrs. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyecto, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANERACIÓN

[Signature]

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Viceactor de Administración
Universidad de la Sierra Sur

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

RECTOR

[Signature]

Mrs. María de los Angeles Parafita Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTTO.

RECTORÍA
