

2020

ANC

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado
JUNIO 2020
 FECHA DE CORTE:

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad de la Sierra Sur**

Entidad federativa: Oaxaca

Clave Inst 911: 20MSU0023N

 Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
 Cargo: Vice - Rector de Administración
 Teléfono: 01 951 57 2 41 00
 Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsi.edu.mx

Planeación


Obras y Mantenimiento

 Nombre: Arq. Requel López Salvador
 Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
 Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
 Correo electrónico: chavane17@hotmail.com y rsalvador@unsi.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obras de construcción	Equipamiento	Adecuaciones y Mantenimiento	Proyecto sustantivo				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Cuenta con Actas								
															¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?			Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Monto de Acta Administrativa		
1	Construcción del Centro de Patología Clínica	X				\$ 15,709,603.00	\$ -	\$ 15,709,603.00	Laboratorios	11	1146.69	Con fecha 30 de junio de 2020 se emite el fallo del proceso de licitación, se iniciaran los trabajos el 02 de julio de 2020	4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la supervisión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado). 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	0	02/07/20	27/01/21	Con fecha 30 de junio de 2020 se emite el fallo del proceso de licitación, se iniciaran los trabajos el 02 de julio de 2020						
2	Planta Purificadora de Agua	X				\$ 397,740.00	\$ -	\$ 397,740.00	Planta purificadora de agua, incluye: Tanque de almacenamiento Hidroneumático, Filtro multicama, Filtro de carbón activado, Filtro suavizador, Filtro pulidor, Lámpara UV, Ósmosis inversa, Tanque de producto terminado, Hidroneumático, Filtro pulidor, Ozono, Lavadora, sanitizadora y llenado de garrafones, ductería de tubo de aluminio de 25 mm x 6 m.	1	0.00	Este proyecto esta en proceso de actualización de precios, para despues Gestionar la autorización del proyocto, ante la Subsecretaría de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.	1. Gestionar ante la Subsecretaría de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado la autorización del recurso para la adquisición de la planta purificadora de agua 2. Ejercer el recurso de acuerdo a la Ley de Adquisiciones vigente, siendo adjudicación, invitación o licitación pública nacional, dependiendo de los montos a ejercer. 3. Emitir el fallo y formalizar la compra a través de la firma de un contrato con el proveedor adjudicado. 4. Recibir la planta purificadora de agua, colocarla y hacer las pruebas necesarias para su buen funcionamiento. 5. Dar seguimiento de las adquisiciones y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado).	0	27/07/20	30/11/20	Este proyecto esta en proceso de actualización de precios, para despues Gestionar la autorización del proyocto, ante la Subsecretaría de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.						
4	Construcción de un Edificio de Cubículos para Profesores, de la DES de Salud	X				\$ 6,516,133.00	\$ -	\$ 6,516,133.00	Cubículos	35	451.41	Con fecha 30 de junio de 2020 se emite el fallo del proceso de licitación, se iniciaran los trabajos el 02 de julio de 2020	4. Comenzar la ejecución del proyecto, con la supervisión de obra correspondiente. 5. Dar seguimiento a la ejecución del proyecto y rendición de cuentas ante las instancias correspondientes (SEP, Congreso de la Unión, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado). 6. Finalizar el proyecto, cuidando la rendición de cuentas.	0	02/07/20	13/11/20	Con fecha 30 de junio de 2020 se emite el fallo del proceso de licitación, se iniciaran los trabajos el 02 de julio de 2020						
									TOTAL	46	723.48												

 Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
 Vicerector de Administración
 Nombre y firma del Titular de la IES

 Arq. Requel López Salvador
 Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.


2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Construcción del Centro de Patología Clínica**

CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN

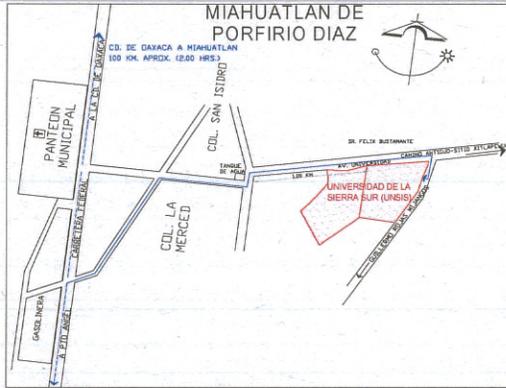

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
 ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
 UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
 DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.



Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1- Area para desplantar el edificio



F2- Mecanica de Suelos para el Edificio



F3- Mecanica de Suelos para el Edificio



F4- Area para desplantar el edificio

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción del Centro de Patología Clínica
 Esta en proceso de actualización de precios, para despues Gestionar la autorizacion del proyecto, ante la Subsecretaría de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

- La fotografia muestra: F1- Area para desplantar el edificio
- La fotografia muestra: F2- Mecanica de Suelos para el Edificio
- La fotografia muestra: F3- Mecanica de Suelos para el Edificio
- La fotografia muestra: F4- Area para desplantar el edificio
- La fotografia muestra: F5:

~~Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
 Vicerector de Administración
 Nombre y firma del Titular de la IES~~



Arg. Raquel López Salazar
 Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

(Handwritten signature)

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD


2

Nombre de la obra: **Planta Purificadora de Agua**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Planta Purificadora de Agua

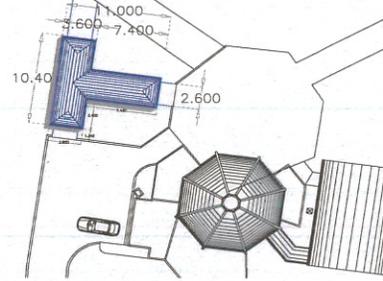

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.



Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1- Área para La Planta Purificadora



F2- Área para La Planta Purificadora



F3- Área para La Planta Purificadora



F4- Área para La Planta Purificadora

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Planta Purificadora de Agua
Esta en proceso de actualización de precios, para despues Gestionar la autorizacion del proyecto, ante la Subsecretaría de Planeación e Inversión de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

- La fotografia muestra: F1- Área para La Planta Purificadora
- La fotografia muestra: F2- Área para La Planta Purificadora
- La fotografia muestra: F3- Área para La Planta Purificadora
- La fotografia muestra: F4- Área para La Planta Purificadora
- La fotografia muestra: F5:

Lic. Erick Alexis Ochoa Alejo
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES



DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTTO.

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña de información en cada una de las pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Junio 2020

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

4

Nombre de la obra: **Construcción de un Edificio de Cubículos para Profesores, de la DES de Salud**



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

0

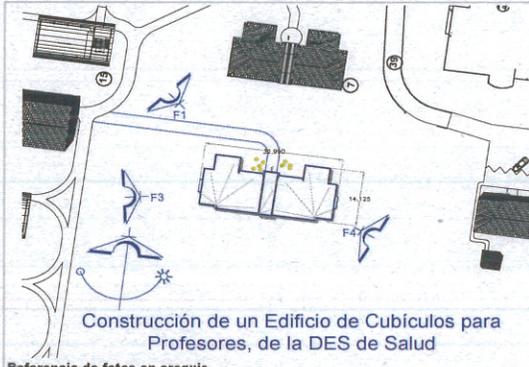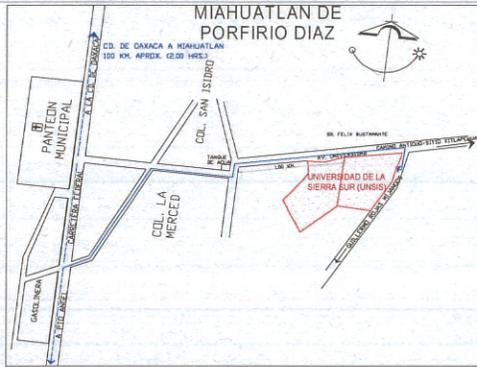

CALLE GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N,
ESQ. AV. UNIVERSIDAD COLONIA CD.
UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO
DÍAZ, OAXACA, C.P. 70800.

Construcción de un Edificio de Cubículos para
Profesores, de la DES de Salud

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1- Mecanica de Suelos para el Edificio



F2- Area para desplantar el edificio (vista aerea)



F3- Mecanica de Suelos para el Edificio



F4- Area para desplantar el edificio

Comentarios de los trabajos realizados:

El proyecto: Construcción de un Edificio de Cubículos para Profesores, de la DES de Salud
Esta en proceso de actualización de precios, para despues Gestionar la
autorización del proyecto, ante la Subsecretaría de Planeación e Inversión de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.

- La fotografia muestra: F1- Mecanica de Suelos para el Edificio
- La fotografia muestra: F2- Area para desplantar el edificio (vista aerea)
- La fotografia muestra: F3- Mecanica de Suelos para el Edificio
- La fotografia muestra: F4- Area para desplantar el edificio
- La fotografia muestra: F5:

~~Lic. Erick Alexis Ochoa Murguía
Vicerector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES~~



Arg. Raquel López Salazar
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana y se copian las pestanas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
