

2024



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Primer Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 09/04/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave 911: 20MSU0023N

Planeación

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFAM, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado), Fechas Reales, Observaciones, Reintegro a la TESOFE, Actas.

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur



DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur



VICE RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

Mra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



RECTORIA

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanta filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFAM, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, Espacios físicos/equipamiento, Fechas Reales, Reintegro a la TESOFE, Actas. Includes project details for 'Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur'.

Summary table with columns: Monto autorizado (A), Monto ejercido (D), Remanente (E) =B-D, Nombre del Espacio/equipo, Cantidad, Metros Cuadrados, Acciones que sustentan el avance, % de avance, Inicio, Término, Observaciones, Línea de Captura, Fecha de pago, Importe, Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO, Fecha, Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESU) MONTO, Fecha.

Signature and stamp of Arq. Raquel López Salvador, Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento, Universidad de la Sierra Sur.



DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTTO

Signature and stamp of Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia, Vicerector de Administración, Universidad de la Sierra Sur.

VICE RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Signature and stamp of Mtra. María de los Angeles Peralta Arias, Rectora, Universidad de la Sierra Sur.

RECTORÍA

1 Se capturarán las especies que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Primer Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 09/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0%

PRIMORDIA 1 Nombre de la obra: **Terminación de la Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad, con Cubierta de Paneles Solares.**



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800

FOTOS



F3- Vista sur-norte del edificio



F2- Vista Este - Oeste



F1- Vista Oeste - Este



F2- Vista Este - Oeste

Observaciones:

El proyecto: Terminación de la Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad, con Cubierta de Paneles Solares.

El proyecto esta en etapa de actualización de presupuesto, para solicitar la autorización ante instancias estatales

La fotografía muestra: F3- Vista sur-norte del edificio


La fotografía muestra: F2- Vista Este - Oeste

La fotografía muestra: F1- Vista Oeste - Este


La fotografía muestra: F2- Vista Este - Oeste

La fotografía muestra: F5-


OBRAS
[Firma]
Ara. Rigoberto López Salazar
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur



PLANEACIÓN
[Firma]
Lic. Erick Alexis Ochoa Yajón
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur



RECTOR
[Firma]
Mtra. María de los Angeles Peralta Atlas
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postal, se podrán copiar tantas postales como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se anexe el informe de diagnóstico para el antes, durante y después de la obra.

CONSTRUCCION Y MTO.

VICE RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Primer Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 09/04/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0%

Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P:70800

FOTOS



F1- Centro de Investigacion en Nutricion y alimentacion (CINA) Laboratorio de antropometría



F2- Hospital Robotizado (HROB) Hospitalización



F3- Centro de Odontología (CEODON) Clínica Dental 2



F4- Centro de Odontología (CEODON) Imagenología

Observaciones:

El proyecto: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur el proyecto esta en etapa de actualización de presupuesto, para solicitar la autorización ante instancias estatales

- La fotografía muestra: F1- Centro de Investigacion en Nutricion y alimentacion (CINA) Laboratorio de antropometría
- La fotografía muestra: F2- Hospital Robotizado (HROB) Hospitalización
- La fotografía muestra: F3- Centro de Odontología (CEODON) Clínica Dental 2
- La fotografía muestra: F4- Centro de Odontología (CEODON) Imagenología
- La fotografía muestra:

OBRAS

Aro, Raniel López Salvador
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

Mc. Erick Alexis Ortiz Valencia
Vicerrector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la obra en tres momentos: antes, durante y despues de la obra.

CONSTRUCCION Y MTO

VICE RECTORIA DE ADMINISTRACION

RECTORIA

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:


Primer Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 09/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRORIDAD: 3 Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

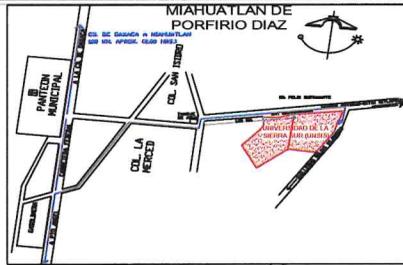

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MUJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P:70800



Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F6- Centro de Odontología (CEODON) Taller Dental



F7- Centro de Tecnologías de la Información (CETI) Lab. Desarrollo de Software

Observaciones:

El proyecto: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur el proyecto esta en etapa de actualización de presupuesto, para solicitar la autorización ante instancias estatales

- La fotografía muestra: F6- Centro de Odontología (CEODON) Taller Dental
- La fotografía muestra: F7- Centro de Tecnologías de la Información (CETI) Lab. Desarrollo de Software
- La fotografía muestra: F8- Centro de Odontología (CEODON) Clínica Dental 1
- La fotografía muestra: F9- Centro Cultural y Deportivo (Gimnasio)
- La fotografía muestra: F10:



F8- Centro de Odontología (CEODON) Clínica Dental 1



F9- Centro Cultural y Deportivo (Gimnasio)

F10:

OBRAS

Arro Rosales López Salazar
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

Lic. Erick Alexis Ochoa Valdez
Vice rector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se pueden copiar tantas copias como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTD

VICE RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

RECTORÍA
