

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca

Clave 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia Cargo: Vice - Rector de Administración Teléfono: 01 951 57 2 41 00 Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

Nombre: Arq. Raquel López Salvador Cargo: Jefa del Deplo. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306 Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, ID de acuerdo con el SIFAM, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución de la obra, Monto autorizado, Remanente, Espacios físicos/equipamiento, Fechas Reales, Observaciones, Reintegro a la TESOFE, Actas.



Signature of Arq. Raquel López Salvador, Jefa del Deplo. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento



Signature of Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia, Vicerector de Administración



Signature of Mtra. María de los Angeles Parra Arias, Rectora

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario. 2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico. 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa: Oaxaca

Clave 911: 20MSU0023N

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia

Cargo: Vice - Rector de Administración

Teléfono: 01 951 57 2 41 00

Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCION DE LA OBRA, Espacios físicos/equipamiento, Fechas Reales, Reintegro a la TESOFE, Actas. Includes project details for 'Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur'.



Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur



Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vice Rector de Administración
Universidad de la Sierra Sur



Mtra. María de los Angeles Perilla Arias
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2024

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Segundo Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 06/07/2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


0%

Nombre de la obra: Terminación de la Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad, con Cubierta de Paneles Solares.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

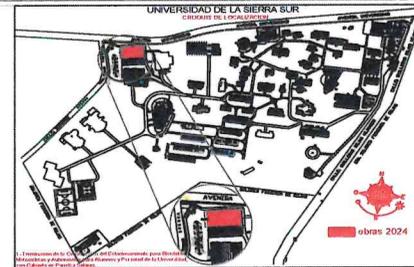

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección
Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P:70800

FOTOS



F3- Vista sur-norte del edificio



F2- Vista Este - Oeste



F1- Vista Oeste - Este



F2- Vista Este - Oeste

Observaciones :

El proyecto: Terminación de la Construcción del Estacionamiento para Bicicletas, Motocicletas y Automóviles para Alumnos y Personal de la Universidad, con Cubierta de Paneles Solares.
El proyecto esta en etapa de actualización de presupuesto, para solicitar la autorización ante Instancias estatales

- La fotografía muestra: F3- Vista sur-norte del edificio
- La fotografía muestra: F2- Vista Este - Oeste
- La fotografía muestra: F1- Vista Oeste - Este
- La fotografía muestra: F2- Vista Este - Oeste
- La fotografía muestra: F5-

OBRAS
Ara. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur



PLANEACIÓN
Lic. Elicel Alvarado Valencia
Vicepresidenta de Administración
Universidad de la Sierra Sur



RECTOR
Mra. María de los Angeles Parraza Rojas
Rectora
Universidad de la Sierra Sur



NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTURGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Segundo Trimestre 2024

Fecha de elaboración 09/07/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


PRIMICIA 3

Nombre de la obra. Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

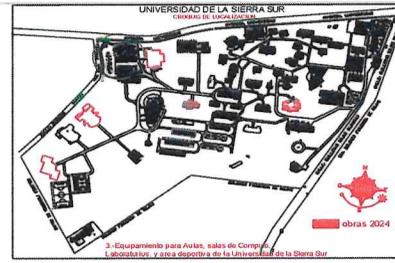

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800



Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F1- Centro de Investigación en Nutrición y alimentación (CINA) Laboratorio de antropometría



F2- Hospital Robotizado (HROB) Hospitalización



F3- Centro de Odontología (CEODON) Clínica Dental 2



F4- Centro de Odontología (CEODON) Imagenología

Observaciones:

El proyecto: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur Se cuenta con el oficio de autorización de la secretaria de finanzas del estado de Oaxaca, actualmente el proyecto está en proceso de validación por parte de la dirección general de tecnologías e innovación digital, para posteriormente solicitar el dictamen correspondiente ante el comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios del estado de Oaxaca

- La fotografía muestra: F1- Centro de Investigación en Nutrición y alimentación (CINA) Laboratorio de antropometría
- La fotografía muestra: F2- Hospital Robotizado (HROB) Hospitalización
- La fotografía muestra: F3- Centro de Odontología (CEODON) Clínica Dental 2
- La fotografía muestra: F4- Centro de Odontología (CEODON) Imagenología
- La fotografía muestra:

OBRAS

Ara. Rafael López Salgado
Jefe del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicepresidente de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR

Mra. María de los Angeles Parra Ariza
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2024

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

Segundo Trimestre 2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Fecha de elaboración 09/07/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMICIA 3

Nombre de la obra: Equipamiento para Aulas, salas de Computo, Laboratorios, y area deportiva de la Universidad de la Sierra Sur

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS, S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COLONIA CD. UNIVERSITARIA, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA. C.P.70800



Porcentaje de avance

0%

FOTOS



F6- Centro de Odontología (CEODON) Taller Dental



F7- Centro de Tecnologías de la Información (CETI) Lab. Desarrollo de Software

Observaciones:

El proyecto: Equipamiento para Aulas y Laboratorios de la Universidad de la Sierra Sur. Se cuenta con el oficio de autorización de la secretaria de finanzas del estado de Oaxaca, actualmente el proyecto está en proceso de validación por parte de la dirección general de tecnologías e innovación digital, para posteriormente solicitar el dictamen correspondiente ante el comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios del estado de Oaxaca

- La fotografía muestra: F6- Centro de Odontología (CEODON) Taller Dental
- La fotografía muestra: F7- Centro de Tecnologías de la Información (CETI) Lab. Desarrollo de Software
- La fotografía muestra: F8- Centro de Odontología (CEODON) Clínica Dental 1
- La fotografía muestra: F9- Centro Cultural y Deportivo (Gimnasio)
- La fotografía muestra: F10:



F8- Centro de Odontología (CEODON) Clínica Dental 1



F9- Centro Cultural y Deportivo (Gimnasio)

F10:

OBRAS
Año: Ruben López Salvador
Jefe de Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración
Universidad de la Sierra Sur

RECTOR
Mtra. María de los Angeles Peralta Altamirano
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTO



NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
