

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Fecha de elaboración: 07/10/2026

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Cargo: Vice - Rector de Administración
Teléfono: 01 951 57 2 41 00, EXT. 1301
Correo electrónico: vice_admin@unsis.edu.mx

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 1306
Correo electrónico: salvadorlr12.77@gmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

OBRA CONCLUIDA

\$14,916,430.00

\$2,224

\$14,916,430.00

\$14,914,205.93

1,632.49

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

M.E.C. Sandra Karina Ramírez Vázquez
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Director Administrativo
Universidad de la Sierra Sur

- 1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tanta filas como sea necesario.
- 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
- 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO
EL RECURSOFAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLESDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

tercer Trimestre 2026

Fecha de elaboración: 07/10/2026

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

2.26

PRIORIDAD 1 Nombre del proyecto: Construcción del Centro de Odontología Clínica (Primera Etapa)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

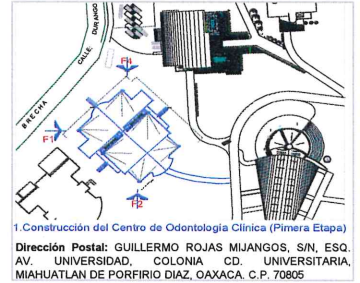

FOTOS



F1- VISTA NORTE



F2-VISTA NOROESTE



F3- VISTA SUR



F4- VISTA ESTE



F5- VISTA SUR-OESTE

Observaciones :

El proyecto:

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ODONTOLOGIA CLINICA (PRIMERA ETAPA)

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, SE HA REALIZADO EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO Y SE ESTÁ HABILITANDO ACERO DEL NUM. 2, NUM. 3, NUM. 4, NUM. 6 Y NUM. 8 PARA CIMENTACIÓN.

La fotografía muestra: F1- VISTA NORTE

La fotografía muestra: F2-VISTA NOROESTE

La fotografía muestra: F3- VISTA SUR

La fotografía muestra: F4- VISTA ESTE

La fotografía muestra: F5- VISTA SUR-OESTE

OBRAS Y MANTENIMIENTO

Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Universidad de la Sierra Sur

DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN Y MTO

RECTORÍA

M.E.C. Sandra Karina Ramírez Vázquez
Rectora
Universidad de la Sierra Sur

PLANEACIÓN

L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia
Director Administrativo
Universidad de la Sierra Sur

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar dichas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
